

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 14. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/12 i 120/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru, za razdoblje od 31. ožujka 2013. do 30. rujna 2013. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva aktom, klase: 023-01/13-01/123, urbroja: 526-04-01-01/1-14-9, od 26. veljače 2014. godine.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK


Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA KOJIM SE PRIHVAĆA IZVIJEŠĆE O STANJU I PROVEDBI INVESTICIJA U ENERGETSKOM SEKTORU ZA RAZDOBLJE OD 31.03.2013.g. -30.09.2013. g.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: Centar) osnovan je 28. ožujka 2012.g. na temelju Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija („Narodne novine“, br. 25/12,120/12). Centar je pravna osoba s javnim ovlastima koja se osnovala s ciljem povećanja financijske učinkovitosti i transparentnosti poslovanja, ubrzavanja procesa odlučivanja u trgovačkim društvima u energetskom sektoru te odgovarajućeg i ciljanog usmjeravanja financijskih sredstava na način koji osigurava najveći i dugoročni ekonomski povrat, stabilan rast te centralizirano i sustavno praćenje investicija u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na činjenicu da djelatnost Centra čine poslovi: analiza poslovanja i planova razvoja trgovačkih društava, izrada prijedloga strategije investicija u energetskom sektoru, kao sastavnog dijela cjelovite strategije upravljanja državnom imovinom, stručna potpora izrade prijedloga programa investicija na temelju višegodišnjih i godišnjih programa u energetskom sektoru, stručna potpora i sudjelovanje u izradi prijedloga programa investicija, stručna potpora i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera, stručna potpora u pripremi i ugovaranju investicija u energetskom sektoru, pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje, izrada pravila praćenja investicija za trgovačka društva, izrada i vođenje Registra svih investicija, priprema prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, predlaganje projekta javno-privatnog partnerstva, provedba postupka odabira privatnog partnera, sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu i/ili provedba projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje i koordinacija investicijskih projekata vezanih za obnovljive izvore energije, uspostavljanje i razvijanje suradnje s nadležnim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama, uspostavljanje i razvijanje suradnje s međunarodnim institucijama iz područja poticanja i razvoja investicija, a osobito investicija u energetskom sektoru, praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija u energetskom sektoru te predlaganje ministru nadležnom za gospodarstvo poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, bilo je potrebno sukladno članku 14. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija izraditi i dostaviti Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstva cjelovito izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru za razdoblje od 31.03.2013.g. -30.09.2013. g.



CEI

Centar za praćenje poslovanja
energetskog sektora i investicija

3. IZVJEŠĆE O STANJU I PROVEDBI INVESTICIJA U ENERGETSKOM SEKTORU

za razdoblje od 31.ožujka.2013.do 30.rujna.2013. godine



Sadržaj

1. UVOD.....	8
2. INVESTICIJE JAVNIH DRUŠTAVA.....	9
3. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI.....	14
4. NACIONALNO KOORDINACIJSKO TIJELO ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST	23
5. JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO.....	27
6. REGISTAR INVESTICIJA.....	31

KRATKI PREGLED

Realizacija investicija za IX mjeseci 2013. (na dan 15.11.2013.)

Sukladno Zakona o centru za praćenje energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/12 i 120/12), Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: Centar) kontinuirano prati realizaciju investicija 54 javnih društava, odnosno ustanova koja spadaju pod nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva poljoprivrede.

Realizirano do 30.09.2013.	7.092 milijuna kuna
Planirano realizirati do 30.09.2013.	<u>8.885 milijuna kuna</u>
U odnosu na 30.09.2012.	108 %
U odnosu na plan na 30.09.2013.	80 %

Plan i realizacija investicija za 2013. (na dan 30. rujna 2013.)

Ukupan plan za 2013.	<u>13.423 milijuna kuna</u>
----------------------	------------------------------------

U prva III kvartala 2013. godine realizacija investicija iznosi **7.092 milijuna kuna** što je **80%** od planiranih vrijednosti, a u odnosu na prethodnu godinu ona je veća za **8%**. Ukupno **12** najvećih društva iz sektora energetike, infrastrukture i poljoprivrede čine **87%** ukupnih javnih investicija. Trenutna realizacija **12** najvećih društva je na **81%** od planiranih investicija do 30. rujna 2013. godine., odnosno na **55%** od ukupnog plana za 2013. godinu.



STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI

TE Plomin C – vrijednost 3.000 milijuna kuna, na finalni natječaj (Request for Proposal) objavljen 2. svibnja 2013. godine javila su se tri ponuditelja koja će imati šest mjeseci za predaju obvezujućih ponuda. Naknadno je odlučeno produženje roka za predaju obvezujućih ponuda do 30. travnja 2014. godine. Zaključivanje Ugovora očekuje se tijekom 2014. godine te nakon toga slijedi početak radova na lokaciji.

LNG Terminal – vrijednost 5.000 milijuna kuna. Trenutno u izradi Studija utjecaja na okoliš, a lokacijska dozvola se očekuje u I. kvartalu 2014. godine., planirani rok završetka projekta tijekom 2018. godine.

Odbojak plinovoda Južni tok – vrijednost 450 milijuna kuna, definiran tijek aktivnosti, u tijeku pregovori sa Gazpromom oko definiranja parametara projekta i međusobnih odnosa.

IAP – ovim projektom Republika Hrvatska će se povezati s TAP plinovodom i otvoriti novi dobavni pravac za JI Europu u iz Srednjeg istoka i Kaspijske regije. Projekt je multinacionalnog karaktera (osim Republike Hrvatske uključene su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija), a sam projekt naslonjen je na projekt TAP. IAP se na TAP veže u albanskom Fieriu. Ukupna dužina plinovoda je 540km, predviđeni kapacitet 5bcm/god, a vrijednost investicije se očekuje u iznosu od oko 6 milijardi kuna.

Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture tvrtki u većinskom vlasništvu RH – Odašiljači projekta – analiza stanja, definiran optimalni modela provedbe i slijedeći potrebni koraci. Sukladno Odluci o načinu operativne provedbe projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 159/2013.), Odašiljači i veze (u daljnjem tekstu: OiV) definirani su kao nositelj projekta uz koordinaciju od strane Centra. Od travnja 2013. godine Centar više ne sudjeluje na projektu, OiV je nastavio raditi na projektu samostalno.



PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

VJETROELEKTRANE

Trenutno je na mreži 254,25 MW. U fazi realizacije su četiri projekta (150,70 MW) u vrijednosti 976,2 milijuna kuna, planirana realizacija projekata je 2013./2014. god. Zacrtna kvota od 400 MW za vjetroelektrane (koliko je moguće priključiti na mrežu bez ugrožavanja stabilnosti sustava) bit će ispunjena tijekom 2014. godine.

HIĐROELEKTRANE


Trenutno je na mreži 21,74 MW. Nema ozbiljnih projekata u realizaciji. Pretpostavlja se da će nakon stupanja na snagu novog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije biti pokrenuti novi projekti te rekonstrukcije postojećih hidroelektrana

BIOMASA

Trenutno je na mreži 6,69 MW. U fazi realizacije je devet projekata (55,830 MW) u vrijednosti 1,2 milijuna kuna, planirana realizacija je 2013./2014. godine.



SUNČANE ELEKTRANE

Trenutno je na mreži 8,99 MW U fazi realizacije su projekti ukupne snage 35,18 MW vrijednosti 80 milijuna kuna.



PROJEKT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

- u tijeku je javno nadmetanje za dva projekta javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP)
 - procijenjena vrijednost projekata je **1.425 milijuna kuna**
- u pripremi sedam projekata JPP-a
 - procijenjena vrijednost projekata je **1.100 milijuna kuna**
 - planirano objavljivanje natječaja u prvoj polovici 2014. godine.



Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske

Sukladno Drugom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2013. godine (u daljnjem tekstu: NApEnU), koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 14. veljače 2013. godine Centar je imenovan Nacionalnim koordinacijskim i provedbenim tijelom za energetske učinkovitosti. Drugim NApEnU, Centru su povjerene aktivnosti provedbe određenih mjera, koordinacije provedbe svih mjera koje provode druge institucije i tvrtke te vođenje informacijskog sustava za praćenje i verifikaciju ostvarenih ušteda energije – drugim riječima, Centru su dodijeljene koordinacijske funkcije koje bi spadale u ingerenciju agencije za energetske učinkovitost. Time se osim jačanja cjelokupnog institucionalnog okvira za provedbu NApEnU pridonosi i učinkovitijem načinu praćenja i izvješćivanja o ostvarenim uštedama energije.

**CEI**CENTAR ZA UČEŠĆE POSREDOVANJE
POSREDOVANJE POSREDOVANJE

REGISTAR INVESTICIJA

- Registar investicija je uspostavljen 1. siječnja 2013. godine.
- na edukacijama za rad s Registrom investicija prisustvovalo je oko 250 zaposlenika javnih društava odnosno ustanova (u daljnjem tekstu: društava) te su dodijeljene i aktivne 233 korisničke licence, koje predstavljaju 70 društava (od kojih 15 društava pripada HEP Grupi).
- zaključno s 31. listopada 2013. godine, 42 društva unijela su podatke o projektima što predstavlja 60% ukupnog broja društava koja su dužna unositi podatke u Registar investicija.
- društva su do navedenog datuma unijela 1.345 investicija, ukupne procijenjene vrijednosti veće od 135.660 milijuna kuna te ostalih investicija ukupne vrijednosti veće od 2.062 milijuna kuna.





1. UVOD

Dana 3. siječnja 2013. godine na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Radne skupine za javne investicije. S ciljem pripremanja prijedloga Vladi Republike Hrvatske za što bolje usklađivanje investicijskih planova te poboljšanje poslovne učinkovitosti rada javnih društava i ustanova koji značajno doprinose provedbi javnih investicija. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Siniša Hajdaš Dončić, imenovan je voditeljem Radne skupine.

Zadaci Radne skupine su:

1. Predlagati Vladi Republike Hrvatske zakonska i druga rješenja kojima će se omogućiti veći stupanj poslovne uspješnosti javnih poduzeća i drugih ključnih nositelja javnih investicija u Republici Hrvatskoj
2. Kontinuirano ocjenjivati izvršenje investicijskih planova od strane ključnih nositelja javnih investicija u Republici Hrvatskoj
3. Donositi prijedloge s ciljem postizanja što većeg stupnja usklađenosti i sinergije u provedbi investicijskih planova među ključnim nositeljima javnih investicija u Republici Hrvatskoj

O radu i zaključcima utvrđenim na sastanku vodi se zapisnik koji se bez odgode dostavlja potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Branku Grčiću. Voditelj Radne skupine izvješćuje potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Branka Grčića i dogovara dinamiku rada jednom u dva tjedna i po pozivu potpredsjednika.

Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavljat će Centar za praćenje i ocjenjivanje energetskog sektora i investicija.


2. INVESTICIJE JAVNIH DRUŠTAVA

2.1. Realizacija investicija za I-III kvartala 2013.

Sukladno Zakonu o centru za praćenje energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/12 i 120/12), Centar je započeo s kontinuiranim praćenjem investicija javnih društava, počevši od lipnja 2012. godine te dostavio Vladi Republike Hrvatske 3. Izvještaj o stanju i provedbi investicija zaključno sa 30. rujnom 2013. godine.

Realizacija investicija do 30. rujna 2013. godine dosegla je razinu od 30% od godišnjeg plana ili IX mjeseci ili 53% od ukupnog plana koji je usvojen na nadzornim odborima društava za čitavu 2013. godinu. U energetskom sektoru najviše poteškoća imaju HEP d.d. i HOPS d.o.o., koji su na 50% realizacije investicija od ukupnog godišnjeg plana. U sektoru infrastrukture Hrvatske željeznice imaju najviše poteškoća u realizaciji, prvenstveno zbog intenzivnog organizacijskog i financijskog restrukturiranja, smanjenih novčanih transfera iz državnog proračuna te kašnjenja u osiguranju vanjskih izvora financiranja.

Grafikon 1. Realizacija investicija javnih društava do 30. rujna 2013.

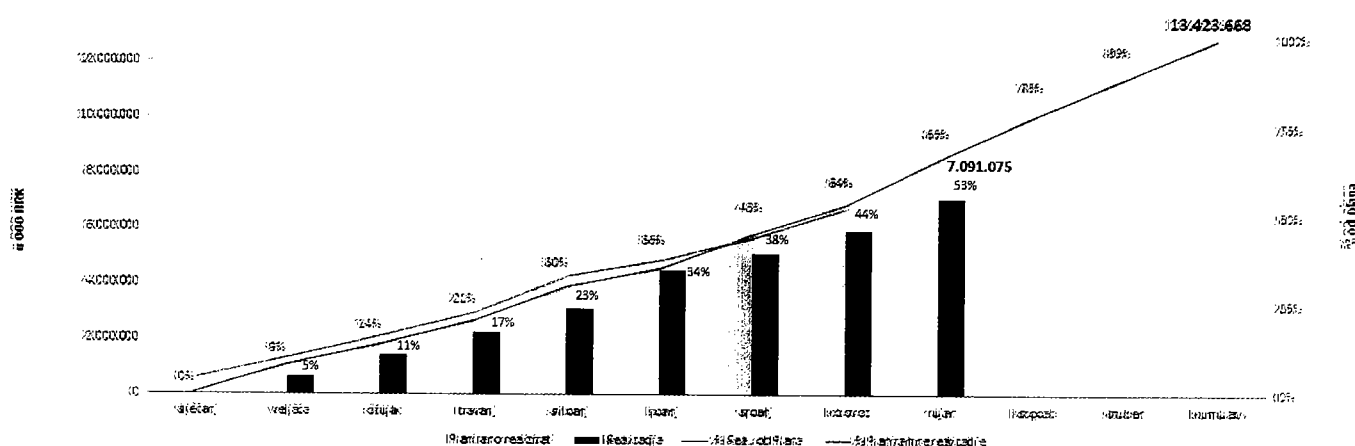

U odnosu na planirane vrijednosti za rujan 2013., stvarna realizacija investicija iznosi 80% planiranih vrijednosti (kumulativno). Promatrano u odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za rujan 2013. je veća za 8% (kumulativno).

Tablica 1. Realizacija investicija javnih društava na 30. rujan 2013. godine u usporedbi sa ukupnim planom i u odnosu na 30 rujan 2012. godine

[illegible]

Kao rezultat povećanja broja povećanju investicijskih aktivnosti i ostvarenju maksimalnih rezultata identificirani su:

- Neuskladenost katastra, zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu, postupci izvlaštenja – manjak ljudi, te različita praksa rješavanja problema po državnim uredima

- odustajanje od pojedinih projekata koji nisu odgovarali potrebama budućeg razvoja (npr. podmorski plinovod Krk-kopno koji nije usklađen s potrebama LNG terminala)
- neizvjesno trajanje postupka trajanja javne nabave u slučaju izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave - kako na dokumentaciju za nadmetanje tako i na odluku o odabiru/poništenju koja može značajno utjecati na trajanje i dinamiku projekta.

Tablica 2. Najznačajniji strateški investicijski projekti u realizaciji

Država	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta (1000 HRK)	Planirana realizacija 2013. (1000 HRK)	Realizacija do 31.10.2013. (1000 HRK)
HAC	A1 Šidlar Ridoč – Dionica Ravča – Ploče	13.048.000	448.1240	1345.782
	IKOST DDAVA	11.158.000	480.043	1174.319
HC	Orehovica – Križišće	1356.041	199.995	1292.797
	Majdan – Hamani Klis (Grlj)	2287.000	110.000	2251.79
HŽ Infrastruktura	Osušavanje i izgradnja pruge na Vrat Kotiboru (Projekt "Iuka")	72.971.042	118.4483	130.155
ILU Zadar	Projekt Nova luka Zadar	11.650.000	118.1230	118.540
ILU Rijeka	Izgradnja kontejnerskog terminala Brajčica I Proširivanje dionice	1199.500	165.700	155.000
HEPGrupa	Revitizacija HE Zakučac	1929.921	112.7180	1100.994
Plinacro	TEŠISAK – Izgradnja dionice C/230 MW i 30 MW	11.687.500	112.7183	1100.958
Janač	Magistralni diinovobitina – Dobrovac	181.500	44.703	42.151
	Terminal Žitjak (modernizacija) i izgradnja TCC i dionice za izgradnju dionice za izgradnju TCC	1175.898	112.7140	112.1521
Hrvatske vode	Slavonski Brod – Projekt "Radošarje vođenog opskrbe i infrastrukture – Slavonski Brod"	1180.195	153.803	112.743
	Dovodni i ispušni kanal za navodnjavanje i dionice opskrbe	450.000	155.700	111.545
		11870.000	222.000	111.545

Na sljedećim strateškim investicijskim projektima je primijećena usporena realizacija u 1. kvartalu 2013.godine u odnosu na planiranu:

- HAC – dionica autoceste A1: Ravča – Ploče, Sredanci – granica BiH
- HC – dionica državne ceste: Orehovica – Križišće, Majdan – Klis, južna obilaznica Osijeka
- HŽ Infrastruktura – izgradnja pruge: Podsused – Samobor – Bregana, Velika gorica – Turopolje, Zagreb, Borongaj – Dugo Selo.

Strateški investicijski projekti čine 60% ukupne realizacije planirane za 2013., što nas upućuje na veliku doprinos u realizaciji planiranih za realizaciju u 2013.

Zaključno s 31. listopada 2013. godine, 11 društva unijela su podatke o projektima što predstavlja 60% ukupnog broja društva koja su dužna unositi podatke u Registar investicija. Društva su do navedenog datuma unijela 11346 investicija, ukupne procijenjene vrijednosti veće od 11.111 milijuna kuna te ostalih investicija ukupne vrijednosti veće od 2.002 milijuna kuna.



2.2. Plan realizacije investicija za 2013.

Plan investicija za 2013. godinu prezentiran u siječnju 2013. godine je iznosio 15.145 milijuna kuna, a do kraja rujna je umanjen za 1.721 milijuna kuna sukladno zadnjem rebalansu proračuna javnih društava odnosno ustanova i iznosi 13.424 milijuna kuna.

Najznačajnija umanjena:

	522 milijuna kuna
	478 milijuna kuna
	302 milijuna kuna
	197 milijuna kuna



Tablica 3. Plan investicija javnih društava za 2013. godinu u odnosu na realizaciju u 2012. godini

Društvo	Realizacija za 2012.	Plan realizacije za 2013.	% 2013. u odnosu na 2012.
	2012	2013	2013/2012
IHBP GRUPA	2.480.254	2.434.404	101%
IJAVAF	297.720	333.045	112%
IRIJWACRO	150.285	101.374	67%
UKUPNO I ENERGETIKA	2.848.229	2.868.823	101%
IHWAC	1.780.898	1.959.599	110%
IHC	1.690.881	1.990.780	118%
IHŽ Cargo	170.183	180.838	106%
IHŽ Infrastruktura	355.309	1.893.415	533%
IHŽ Rutnički prijevoz	34.695	576.445	1661%
Iuđke i uprave	573.894	607.560	106%
I Zračne luke	95.616	171.095	179%
I Ostali (MPP)	620.484	805.364	81%
UKUPNO I PROMET, I PROMORSTVO I	5.921.125	7.885.095	143%
INFRASTRUKTURA			
I HAVATSKEWODE	2.080.716	1.551.843	75%
I HAVATSKESJUME	490.901	618.925	126%
UKUPNO I POLJOPRIVREDA	2.571.617	2.170.569	84%
IFZOB	257.933	346.299	134%
I OSTALI	186.269	152.882	77%
UKUPNO	11.055.172	12.423.682	112%

Ostvarenjem prognoza izraženih u Tablici 3. poslovna godina završila bi rastom investicija od 21% u odnosu na 2012. godinu.

3. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI

Sukladno Zakonu o centru za praćenje energetskeg sektora i investicija, Centar je preuzeo aktivnosti vezane uz realizaciju strateških projekata od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, poticanje realizacije projekata u domeni obnovljivih izvora energije i koordinaciju poslovanja javnih tvrtki u energetskeg sektoru.

3.1. Realizacija strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Centar svoje aktivnosti posebno usmjerava na konkretne i aktualne strateške projekte u pripremi i realizaciji. Aktivnostima je obuhvaćen širok spektar projekata trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na slijedeće:

LNG Terminal

Projekt LNG terminala obuhvaća izgradnju terminala za prihvat skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na lokaciji Omišalj na Krku. Investicija se procjenjuje na 5,3 milijardi kuna. Izgradnjom terminala omogućiti će se novi dobavni pravac plina što će pozitivno utjecati na sigurnost opskrbe plinom, a potencijalno i na cijene plina kako u Hrvatskoj tako i u gravitirajućoj regiji. Značaj projekta povećan je odlukom o izgradnji plinovoda TAP i IAP.




Slika 4. Prikaz lokacije predviđene za izgradnju LNG terminala, uz postrojenje DIOKI u Omišlju

Obzirom na karakter i značaj investicije, te značajan broj uključenih dionika projekta, Centar koordinira i vodi razvoj ovog strateškog projekta. Odlukom o imenovanju predstavnika Ministarstva gospodarstva (KLASA: 080-01/13-01/77, Ur.Br. 526-02-02-02/1-13-1) iz lipnja 2013. imenovan je član uprave Centra za energetiku ispred Ministarstva gospodarstva za koordinatora svih aktivnosti razvoja i implementacije projekta LNG Terminala. U proteklom razdoblju izvršene su slijedeće značajne aktivnosti:

- U tijeku je prijenos 100% vlasništva nad „LNG Hrvatska“ na HEP d.d. zbog zahtjeva 3. Energetskog paketa te poslovnih razloga
- U kolovozu 2013. godine je Državni ured za upravljanje državnom imovinom preuzeo aktivnosti oko rješavanja pitanja vlasništva zemljišta za terminal te pitanja koncesije za pripadajuće pomorsko dobro
- U rujnu je na Ministarstvo zaštite i prirode predana Studija Utjecaja na okoliš (SUO), sa zahtjevom za početak postupka Procjene utjecaja na Okoliš (PUO)
- U listopadu 2013. godine dovršen je finalni nacrt Studije izvodljivosti te su u tijeku usuglašavanje i korekcije iste kako bi se usvojila konačna verzija. Očekivano usvajanje je tijekom studenog 2013. godine.
- Definirani su osnovni tehnički parametri terminala:
 - Kopneni terminal
 - Kapacitet 5-6 bcm
 - Volumen spremnika: 2x180.000 m³
 - Tehnologija uplinjavanja: potopljeni plinski plamenici (SCV)
- Temeljem usvojenih navedenih tehničkih parametara napravljena je procjena investicijskih troškova na 4,5 milijardi kuna
- Započeti su razgovori sa potencijalnim strateškim partnerima, dobavljačima i kupcima plina. Inicijalni razgovori za različite segmente poslovnog modela (dobava LNG-a, izgradnja, investiranje i upravljanje terminalom, preuzimanje plina iz LNG terminala) vođeni su sa brojnim međunarodnim i regionalnim kompanijama. U ovoj fazi razgovora zabilježen je interes kompanija za različite segmente predloženog poslovnog modela. Izvještaj o navedenom očekuje se tokom prosinca 2013. godine.
- zainteresiranost kompanija iz okruženja izuzetno je porasla nakon odluke konzorcija Shah Deniz da se transport Kaspijskog plina u Europu obavlja plinovodom TAP umjesto Nabucco west. Osim što su time ostvareni preduvjeti za realizaciju projekta IAP, istočna i srednja

Europa ostale su bez mogućnosti dopreme kaspiskog plina. Time je povećan potencijal plasmana plina iz LNG terminala u Omišlju u te zemlje.

- Potencijalno konkurentski projekti LNG terminala u Tršćanskom zaljevu, naišli su na protivljenje talijanskog Ministarstva zaštite okoliša te Slovenije. Time je također poboljšana pozicija projekta LNG terminala u Omišlju.
- Centar je definirao poslovni model za potencijalne buduće strateške partnere. Model se pojednostavljeno može prikazati na slijedeći način:

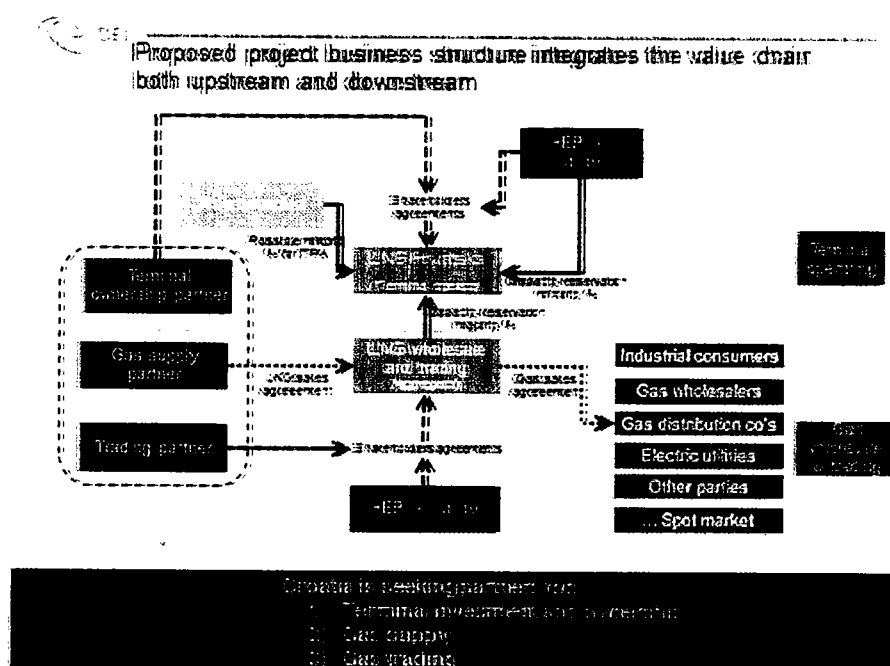

Navedenim poslovnim modelom ostvaruju se brojne prednosti za dionike te se olakšava realizacija i financiranje planiranog terminala.




IAP

Ovim projektom Hrvatska će se povezati s TAP plinovodom i otvoriti novi dobavni pravac za jugoistočnu Europu u iz Srednjeg istoka i Kaspijske regije. Projekt je multinacionalnog karaktera (osim Hrvatske uključene su BiH, Crna Gora i Albanija), a sam projekt naslonjen je na projekt TAP. IAP se na TAP veže u albanskom Fieriu.

Osnovne značajke/ podaci o projektu su slijedeći:

- Projektom se otvaraju nova tržišta plinom: BiH, Albanije i Crne Gore te dijela Hrvatske koji nije plinificiran, a ostvaruje se i mogućnost tranzita prirodnog plina za srednju i zapadnu Europu
- Ukupna dužina plinovoda je 540km, predviđeni kapacitet 5bcm/god, a vrijednost investicije se očekuje u iznosu od oko 5 milijardi Kn

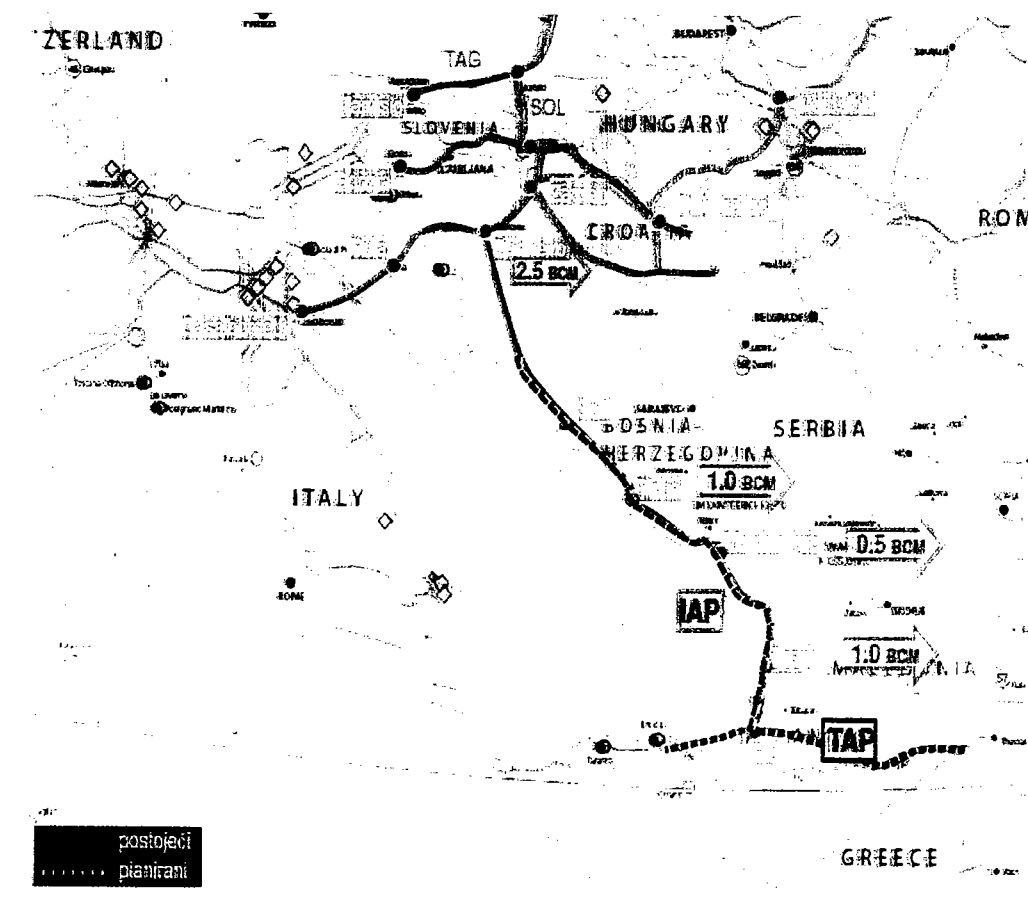

Za razvoj hrvatskog dijela IAP projekta Plinacro je dobio sredstva WBIF-a, te su potrebne pripremne aktivnosti za hrvatske dionice.

Za studiju izvodljivosti za cjelokupni IAP uključujući studiju utjecaja na okoliš (SUO) i *cost benefit* analizu (CBA) od strane Republike Hrvatske (Plinacro), odobreno je 20.8 milijuna kuna (u 06/2011). Završetak izrade studija očekuje se u veljači 2014. godine.

Obzirom na brojne dionike uključene u projekt, Centar koordinira aktivnosti na razvoju i pripremi projekta. U tijeku je izrada slijedeće dokumentacije:

- Studije utjecaja na okoliš
- Studije izvodljivosti
- Poslovnog modela

Također su u tijeku i koordinacijski razgovori s nadležnim Ministarstvima i institucijama ostalih uključenih zemalja (Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Dinamika projekta biti će usklađena s dinamikom projekta TAP.

3.2. Poticanje realizacije projekata u domeni obnovljivih izvora energije (OIE)

Centar je sudjelovao u izradi Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije do 2020. godine. (u daljnjem tekstu: NAP). Republika Hrvatska je temeljem Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009., o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmijeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji Hrvatske trebao iznositi najmanje 20%.


Kako bi se ostvario ovaj glavni cilj, svaka država članica dužna je donijeti NAP za obnovljive izvore energije u kojem se određuje ukupni nacionalni cilj za obnovljive izvore energije prema propisanoj metodologiji te sektorski ciljevi i predviđanja u proizvodnji električne energije, energije za grijanje i hlađenje te energije u prijevozu iz obnovljivih izvora.

NAP obrazlaže postojeću i planiranu politiku, instrumente i mjere te mehanizme s kojima se planiraju ostvariti ciljevi do

2020. godine. U NAP-u su izračunati ciljevi, sukladno trenutnim tržišnim pokazateljima, koje je potrebno ostvariti putem sustava za poticanje te ostalih mjera kako bi se ostvario ukupni cilj od 20%.

S obzirom na to da su aktualni tržišni pokazatelji različiti od onih pretpostavljenih Strategijom

Trendovi finalne potrošnje energije u RH

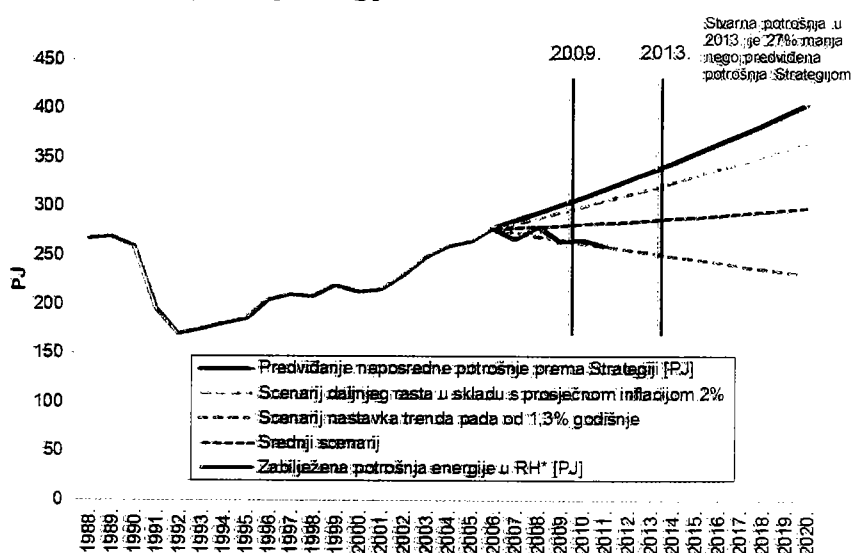

*Izvor „Energija u Hrvatskoj 2011.“, EIHP

energetskog razvoja Republike Hrvatske, ciljevi postavljeni u NAP-u se razlikuju od onih predviđenih predmetnom Strategijom. U podacima o bruto neposrednoj potrošnji energije (izvor: EIHP Energija u Hrvatskoj) zabilježen je kontinuirani pad od 2006. godine (s prosječnom godišnjom stopom od 1,3%), dok je prema Strategiji predviđen prosječni rast do 2020. od 2,7% godišnje, do iznosa od 409,6 PJ



Jedna od mjera poticanja obnovljivih izvora energije je i isplata poticajne cijene sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (dalje: Tarifni sustav). Centar je izradio Program državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (dalje: Program) čiji je sastavni dio Metodologija za izračun poticajnih cijena, koja definira poticajne cijene iz predmetnog Tarifnog sustava. Program je izrađen sukladno Smjernicama Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša (52008XC0401(03), Službeni list EU C 82, od 1. travnja 2008.).

Cilj Programa državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije je omogućavanje ispunjenja obveze od 20% udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji sukladno Direktivi 2009/28/EZ. Programom se uspostavlja financijski okvir za poticanje OIE u skladu sa preuzetim obvezama Republike Hrvatske u članstvu u Europskoj Uniji. Potpore iz Programa predviđene su zbog toga što je trošak proizvodnje OIE znatno viši od troška proizvodnje iz izvora manje prihvatljivih za okoliš. Istodobno, visoki trošak proizvodnje energije iz OIE ne dozvoljava poduzetnicima da zaračunavaju konkurentne cijene na tržištu, čime se stvaraju zapreke pristupa tržištu obnovljivih izvora energije. U 2012. godini prema Eurostat metodologiji implementiranoj u aplikaciji SHARES, udio OIE u bruto finalnoj potrošnji energije u Hrvatskoj iznosi 15,5%.

Grupe postrojenja	Novo poticajne cijene u kn/kWh			Grupe postrojenja	Dosadašnje poticajne cijene u kn/kWh		
Integrirane sunčane elektrane				Integrirane sunčane elektrane			
0-10 kW		1,38	1,91	0-10 kW		2,1	2,63
10 - 30 kW		1,17	1,70	10 - 30 kW		1,7	2,23
30 - 300 kW		1,01	1,54	30 - 300 kW		1,12	1,65
Elektrane na biomasu*				Elektrane na biomasu*			
0 - 300 kW		0,77	1,30	0 - 300 kW		0,77	1,30
300 kW - 2 MW		0,73	1,25	300 kW - 2 MW		0,67	1,20
2MW - 5 MW		0,67	1,20	2MW - 5 MW		0,62	1,15
Elektrane na bioplin **				Elektrane na bioplin **			
0 - 300 kW		0,81	1,34	0 - 300 kW		0,89	1,42
300 kW - 2 MW		0,73	1,26	300 kW - 2 MW		0,67	1,20
2MW - 5 MW		0,65	1,18	2MW - 5 MW		0,59	1,12
Hidroelektrane				Hidroelektrane			
0 - 300 kW		0,54	1,07	0 - 300 kW		0,07	0,60-1,20
300 kW - 2 MW		0,4	0,93	300 kW - 2 MW		0,47	0,57-1,00
2 MW - 5 MW		0,35	0,88	2 MW - 5 MW		0,47	0,57-1,00
Geotermalne elektrane				Geotermalne elektrane			
0 - 5 MW		0,67	1,20	0 - 5 MW		0,67	1,20
kn/kWh	0	0.5	1	1.5	2	2.5	
* RC - referentna cijena	Ostatak do poticajne cijene			* PPC - prosječna proizvodna cijena	Ostatak do poticajne cijene		

* Elektrane na biomasu, uključujući biorazgradive dijelove industrijskog i komunalnog otpada

** Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla, biorazgradivog otpada, deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

**CEI**Centar za proučavanje poslovanja
energetičkog sektora i investicije

U cilju optimizacije procesa i uklanjanja barijera prilikom realizacije investicija u obnovljive izvore energije, Centar je osim izrade Programa državnih potpora za obnovljive izvore energije sudjelovao u izradi svih relevantnih podzakonskih akata koji se tiču obnovljivih izvora energije. Centar je sudjelovao u izradi Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 133/13, 15./16.12.2014) (za koji je unutar Programa državnih potpora izračunao poticajne cijene), Uredbi o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013.) te Pravilniku o sučeljavanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije (Narodne novine, broj 132/13)



4. NACIONALNO KOORDINACIJSKO TIJELO ZA ENERGETSKU UČINKOVOTOST

Sukladno europskoj Direktivi 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ izrađen je i usvojen Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. - 2016. godine. U njemu su propisani ciljevi energetskih ušteda i podloga je za izradu trogodišnjih nacionalnih planova energetske učinkovitosti za tri trogodišnja razdoblja do 2016. godine.

Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) Republike Hrvatske donosi se sukladno zahtjevima članka 14.1 Direktive 2006/32/EC o energetske učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD), kojim se od država članica Europske unije (EU) zahtijeva da svake tri godine izrade i predaju Europskoj komisiji (EK) planovi koji sadrže mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.

Prema Drugom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti (NAPEnU) za razdoblje do kraja 2013., koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 14. veljače 2013. Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija imenovan je nacionalnim koordinirajućim i provedbenim tijelom za energetske učinkovitosti.

Drugim NAPEnU Centru su povjerene aktivnosti provedbe određenih mjera, koordinacije provedbe svih mjera koje provode druge institucije i tvrtke te vođenje informacijskog sustava za praćenje i verifikaciju ostvarenih ušteda energije – drugim riječima, Centru su dodijeljene koordinacijske funkcije koje bi spadale u ingerenciju agencije za energetske učinkovitost. Time se osim jačanja cjelokupnog institucionalnog okvira za provedbu NAPEnU pridonosi i učinkovitijem načinu praćenja i izvješćivanja o ostvarenim uštedama energije.

Također, prema Drugom NAPEnU Centru su dodijeljene i aktivnosti poticanja i predlaganja promjena, te sudjelovanje u izradi zakonskih i provedbenih propisa, programa i planova središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima. Osim toga, sve ostale institucije i tvrtke koje provode aktivnosti i mjere poboljšanja energetske učinkovitosti dužne su izvještavati Centar o tim aktivnostima.

Kao ovaj našin Centar je posvećeno središnje tijelo koje će raspolagati informacijama o svim aktivnostima iz područja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj te će imati bazu podataka o ostvarenim uštedama koja je ključan alat za izvještavanje i definiranje novog ciklusa mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnog cilja ušteda energije.

Zatečeno stanje

U proteklom trogodišnjem razdoblju postojeća institucionalna struktura Republike Hrvatske pokazala se nedostatnom i izrazito nedjelotvornom. Postojeći administrativni kapaciteti bili su nedostatni. Također, veliki broj učesnika u provedbi politike energetske učinkovitosti (Ministarstva, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Energetski institut Hrvoje Požar, jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne energetske agencije.) te nejasna podjela uloga kao i preklapanje pojedinih aktivnosti uzrokovala je velike poteškoće i kašnjenja u izvršavanju svih obveza. Dodatno, u proteklom se razdoblju propustilo uspostaviti sveobuhvatan sustav praćenja aktivnosti koje se provode na nacionalnoj i na lokalnoj/regionalnoj razini, a bez takvog sustavnog praćenja nije moguća niti precizna ocjena ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u NApEnU kao i aktivnosti koje su potaknute tim mjerama.

Osim navedenog do sada je snažno bio izražen nedostatak suradnje i koordinacije među učesnicima provedbe politike energetske učinkovitosti, što je usporavalo i otežavalo provedbu aktivnosti kako na donošenju potrebnih zakona i propisa, tako i u provedbi mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. Potrebno je osigurati da sva ministarstva rade prema NApEnU, jer je to dokument kojega usvaja Vlada Republike Hrvatske.

Centar je pripremio pregled stanja provedbe mjera i ostvarenja ciljeva EnU na nacionalnoj razini. Konstatirano je da **ne možemo biti zadovoljni s dosadašnjom realizacijom** i da je potrebno čim prije krenuti s daljnjim konkretnim aktivnostima koordinacije provedbe mjera, kako bi se čim više ublažio loš dosadašnji rezultat jer već sada je znakovito da se mjere i ciljevi iz Drugog NApEnU neće ostvariti.



Trenutno je u procesu izrada Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije, kao IT alata te uključivanje svih obveznika provedbe mjera na korištenje ovog sustava. Pomoću ovog alata uspostaviti će se središnje mjesto na kojem ćemo imati informaciju o stanju i razvoju energetske učinkovitosti te s koje će se moći pratiti provedba politike energetske učinkovitosti.

Također, Centar trenutno prikuplja podatke svih obveznika provedbe politike energetske učinkovitosti o realiziranim aktivnostima na nacionalnoj razini:

- 20 županija,
- 120 gradova,
- Ministarstva i ostala tijela središnje državne uprave,
- Energetska poduzeća,
- ESCO tvrtke,
- Bankarski sektor, HBOR; EBRD, EIB, komercijalne banke,
- Regionalne energetske agencije,
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,
- Državni ured za središnju javnu nabavu,
- Program Ujedinjenih naroda u RH
- Hrvatska energetska regulatorna agencija
- Energetski institut Hrvoje Požar i dr.

Iz ovih podataka pripremit će se trogodišnje izvješće o provedbi energetske učinkovitosti kao i sljedeći ciklus mjera, kroz 3. Nacionalni akcijski plan za energetske učinkovitost.

Potrebna financijska sredstva za rad Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetske učinkovitost do sada nisu još nisu dobivena, a i sve je manje vremena da se odrade potrebne aktivnosti do kraja godine (Drugi NAPEnU propisuje nacionalne mjere koje je potrebno provesti do kraja 2013. godine), Centar je već započeo s koordinacijskim aktivnostima s ključnim institucijama. Ipak, potrebne aktivnosti teško i presporo se odrađuju radi potkapacitiranosti Centra u ovom području (za sada samo jedan djelatnik radi na ovome) te se zahtjeva dodatni kadar u najkraćem mogućem roku, što ovisi o dobivanju financijskih sredstava.

**CEI**Javna agencija za održivi razvoj
energetskog sektora i investicije**Plan za naredno razdoblje:**

- Koordinacijom provedbe s ključnim institucijama pokrenuti i realizirati čim je više moguće mjera prema NApEnU (posvetiti se ključnim mjerama - 10 mjera pridonosi ispunjenju 70% ciljeva na nacionalnoj razini),
- Pokrenuti i voditi informacijski sustav: SMIV (sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije),
- Prikupiti i verificirati podatke o realizaciji mjera te verificirati učinke provedenih mjera EnU za posljednje 3 godine kao podloga i priprema za Treći Nacionalni akcijski plan za energetske učinkovitost (3. NApEnU),
- Pripremiti 3-godišnji izvještaj o provedbi energetske učinkovitosti na Nacionalnoj razini.

5. JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO

Tijekom 2012. i 2013. godine, sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12) Centar je proveo preliminarne analize i dostavio Agenciji za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) informaciju o namjeri provedbe projekta za sedam potencijalnih JPP projekata.

Do kraja rujna 2013. godine, status JPP projekata, prema tablici:

JPP PROJEKTI			DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKTA I IZVRŠENE OBLAVNOSTI I OBLAVNOSTI DATUMI								
R.b.	Naziv	KAPITALNA VREDNOST PROJEKTA (bez PDV-a i PDV-a)	SPOLAZUM RESORNO MINISTARSTVO NIS	KOMPARATOR USLOVA	INFORMACIJE O NAMJERI PROVEDBE PROJEKTA DOSTAVIJE AGENCIJI ZA JPP		DOSTAVA PRIJEDLOGA PROJEKTA I ODOBRENJE AGENCIJE ZA JPP WAG-EP		POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE
					NAMER PROJEKTA DOSTAVIJE AGENCIJI ZA JPP	DOSTAV PRIJEDLOGA PROJEKTA I ODOBRENJE AGENCIJE ZA JPP WAG-EP	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE			
1	TRG PRAVDE U ZAGREBU	1.297.500.000	POTPISAN	IZRAĐENO	IZVRŠENO	ODOBRENO	KOLOVOZ 2013.	SVIBANJ 2014.	STUDENI 2015.	TRAVANJ 2019.	
2	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" U POPOVAČI	123.750.000	POTPISAN	IZRAĐENO	IZVRŠENO	ODOBRENO	IZVRŠENO	STUDENI 2013.	OŽUJAK 2014.	PROSINAC 2015.	
3	HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ	126.000.000	POTPISAN	U TIJEKU	IZVRŠENO	PROSINAC 2013.	SUEČANJ 2014.	SVIBANJ 2014.	LISTOPAD 2014.	SRPANJ 2016.	
4	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	300.000.000	U TIJEKU	U TIJEKU	LISTOPAD 2013.	SUEČANJ 2014.	OŽUJAK 2014.	KOLOVOZ 2014.	SUEČANJ 2015.	RUJAN 2016.	
5	ŠKOLE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI (6 škola)	173.250.000	U TIJEKU	IZRAĐENO	IZVRŠENO	PROSINAC 2013.	VELJAČA 2014.	LIPANJ 2014.	KOLOVOZ 2014.	VELJAČA 2016.	
6	ŠKOLE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI I GRADU POREČU (4 škole)	146.250.000	U TIJEKU	U TIJEKU	IZVRŠENO	PROSINAC 2013.	VELJAČA 2014.	LIPANJ 2014.	KOLOVOZ 2014.	VELJAČA 2016.	
7	ŠKOLE U GRADU DUBROVNIKU (2 škole)	102.000.000	U TIJEKU	IZRAĐENO	IZVRŠENO	PROSINAC 2013.	VELJAČA 2014.	LIPANJ 2014.	KOLOVOZ 2014.	VELJAČA 2016.	
8	ŠKOLE U GRADU KOPRIVNICI (3 škole)	99.000.000	U TIJEKU	U TIJEKU	STUDENI 2013.	OŽUJAK 2013.	SVIBANJ 2014.	LISTOPAD 2014.	PROSINAC 2014.	RUJAN 2016.	
9	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV	138.000.000	U TIJEKU	U TIJEKU	IZVRŠENO	OŽUJAK 2014.	SVIBANJ 2014.	RUJAN 2014.	STUDENI 2014.	OŽUJAK 2016.	
	UKUPNO	2.505.750.000									

Tablica 7. Pregled JPP projekata i trenutni status

U vremenu od veljače do kolovoza 2013. godine, sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/2012.) Centar je izradio, dostavio i ishodio od Agencije odobrenje za dva prijedloga projekta JPP-a:

Naziv projekta	Prijedlog projekta JPP-a	STATUS
Trg Pravde u Zagrebu	ODOBREN	U tijeku javno nadmetanje
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot u Popovači	ODOBREN	U tijeku javno nadmetanje

5.1. Trg pravde u Zagrebu

Naručitelj

Ministarstvo pravosuđa

Procijenjena Kapitalna vrijednost projekta (bez PDV-a)

1.300 milijuna kuna

Ugovorni oblik JPP-a

Plaćanje za raspoloživost prostora
(availability fee)

Razdoblje trajanja ugovora


30 godina

priprema i građenje (5 godina ; 2014.-2018.)

uporaba (25 godina ; 2019.-2044.)

Postupak odabira Privatnog partnera

NATJECATELJSKI DIJALOG

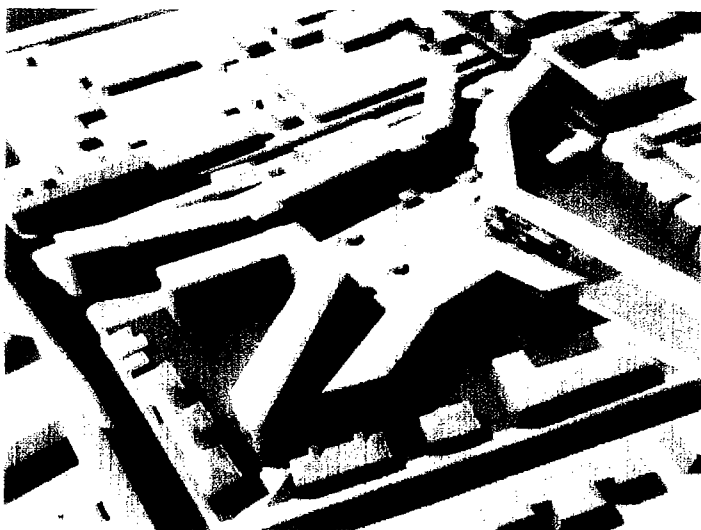

Slika 12. Trg Pravde

PLANNED INFRASTRUCTURE PROJECTS

ŽUPANIJSKI SUD	17.331,00 m ²
OPĆINSKI SUD	29.281,00 m ²
TRGOVAČKI SUD	11.765,00 m ²
PREKRŠAJNI SUD	13.891,00 m ²
OPĆ.DRŽ.ODVJETNIŠTVO	7.534,00 m ²
PRAVOSUDNA AKADEMIJA	3.103,00 m ²
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI (restoran, služba održavanja, sklonište, kongresna dvorana i sl.)	6.103,00 m ²
GARAŽA	49.948,00 m ²
UKUPNO	138.956,00 m²



5.2. Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot u Popovači

Naručitelj

Ministarstvo zdravlja

Procijenjena Kapitalna vrijednost projekta (bez PDV-a)

125 Mil. KN

Ugovorni oblik JPP-a

Proračunski model

Razdoblje trajanja ugovora priprema i građenje (5 godina ;
2014.-2018.) uporaba (25 godina ; 2019.-2044.)

27 godina

Postupak odabira Privatnog partnera

OGRANIČENI POSTUPAK



Panorama Zastada za forenzičku psihijatriju

Slika 13. Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot u Popovači

Za ostale potencijalne JPP projekte, u tijeku je rješavanje tehničke problematike i prijedlozi projekta JPP-a su u izradi.

Tablica 8. Pregled JPP projekata u pripremi

Naziv projekta	Tehnička problematika	Prijedlog projekta JPP-a
Varaždinska županija - (6) ŠKOLA	Čekaju se Odluke predstavničkih tijela kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Sporazuma o realizaciji JPP projekata s Centrom	IZRADA U TIJEKU
Istarska županija i Grad Poreč - 4 ŠKOLE	Čekaju se Odluke predstavničkih tijela kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Sporazuma o realizaciji JPP projekata s Centrom	IZRADA U TIJEKU
Grad Dubrovnik - 2 ŠKOLE	Čekaju se Odluke predstavničkih tijela kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Sporazuma o realizaciji JPP projekata s Centrom	IZRADA U TIJEKU
Hrvatski povijesni muzej	Čeka se dostava konačnih tehničkih parametara od Ministarstva kulture	IZRADA U TIJEKU
Opća bolnica Varaždin	Čeka se odobrenje specifikacije medicinske opreme od Ministarstva zdravlja i potpis Ugovora o realizaciji JPP projekta od Ministarstva zdravlja, bolnice i Centra (po potpisu Agenciji će se dostaviti Informacija o namjeri provedbe projekta)	IZRADA U TIJEKU
Koprivnica – 3 škole	Čeka se Odluka predstavničkih tijela kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Sporazuma o realizaciji JPP projekata s Centrom	IZRADA U TIJEKU
Hrvatski državni arhiv	Čeka se dostava konačnih tehničkih parametara od Ministarstva kulture	IZRADA U TIJEKU

Ukoliko se riješi tehnička problematika i Centar će izraditi prijedloge projekta JPP-a te Agencija iste odobri, očekivano raspisivanje nadmetanja za izbor privatnog partnera je u prvoj polovici 2014. godine

6. REGISTAR INVESTICIJA

Centar je krajem 2012. godine započeo s edukacijama odgovornih osoba društava za korištenje Registra investicija, uključujući i uvažavanje njihovih komentara za prilagodbom postojećih poslovnih procesa unutar Registra kako bi se vjernije prikazali procesi pojedinog društava. Nakon održanih edukacija korisnici su 24. siječnja 2013. godine zaprimili upute za pristup Registru investicija te su pristupili unosu podataka o projektima. Tijekom početnog unosa podataka, ukoliko je postojala potreba za doradom Registra, navedeno se provodilo u dogovoru sa društvom koje je izmjene zahtijevalo. Sve važnije dorade, odnosno izmjene završene su s 31. ožujkom 2013. godine.


Na edukacijama za rad s Registrom investicija prisustvovalo je oko 250 zaposlenika javnih društava odnosno ustanova te su dodijeljene i aktivne 233 korisničke licence, koje predstavljaju **70 društava** (55 društava te 15 društava iz HEP Grupe).

S obzirom na dinamiku unosa podataka u Registar investicija, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Branko Grčić, dopisom od 6. ožujka 2013. godine, svim društvima je odredio 30. ožujka 2013. godine kao krajnji rok unosa svih projekata i pripadajućih podataka u Registar investicija. Uzimajući u obzir navedeno sve aktivnosti unosa, obrade i analize podataka u Registru investicija službeno su aktivne s početkom svibnja 2013. godine, ovisno o aktivnostima korisnika unosa tijekom unosa podataka u Registar.

Zaključno s 31. listopadom 2013. godine, ~~42 društava~~ unijela su podatke o projektima što predstavlja 60% ukupnog broja društva koja su dužna unositi podatke u Registar investicija. Društva su do navedenog datuma unijela ~~1134 investicija~~, ukupne procijenjene vrijednosti veće od ~~19000 milijuna kuna~~ te ostalih investicija ukupne vrijednosti veće od ~~21000 milijuna kuna~~.


Podaci o projektima bit će javno dostupni nakon završnog usklađivanja podataka s korisnicima unosa u obliku generiranog izvješća. Tijekom navedenog usklađivanja podataka, provjerava se ispravnost prethodno dostavljenih podataka o investicijama te postojećim podacima u Registru. Nakon potvrde odgovornih osoba u dogovoru sa zaposlenicima Centra da su podaci u Registru ispravni i istovjetni prethodno dostavljenim podacima, praćenje podataka od 1. listopada 2013. godine temelji se na podacima dobivenim iz Registra. Isto tako, nakon odobravanja podataka i njihovog usklađivanja s evidencijom društava, izrađivat će se detaljnija i kompleksnija izvješća (predefinirana izvješća) u odnosu na prikupljene podatke.

Postojeće stanje

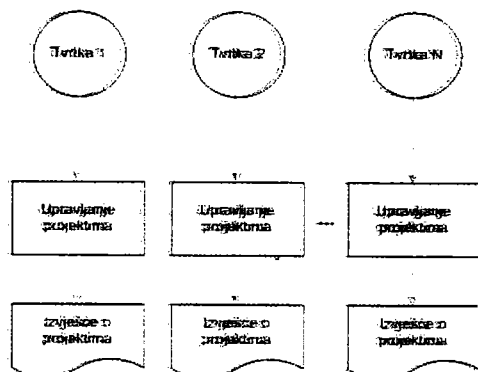

- Ne postoji mogućnost utvrđivanja statusa projekata
- Ne postoji objašnjenje zašto određeni projekti, odnosno investicije nisu realizirani
- Nije postoji odgovornost za (ne)realizaciju projekata
- Nije postoji koordinacija projekata između više pravnih osoba koje su u vlasništvu Republike Hrvatske

Buduće stanje

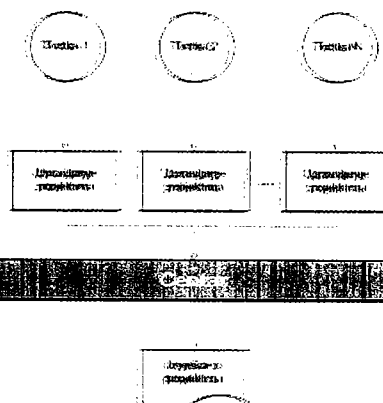

- Strojnj nadzor projekata ključnih pravnih osoba u kojima je Republika Hrvatska manjinski ili većinski vlasnik
- Sustav obavješćivanja o postojećim projektima
- Strojnja koordinacija pojedinih projekata
- Uključivanje u postojeći registar te stvaranje središnjeg lista za upravljanje i nadzor investicija od državnog značaja

Slika 14. Registar investicija (prije i poslije)

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Josip Borak

