



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

**Godišnje izvješće
Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008.
godinu**

Svibanj 2009.

Naslov dokumenta

Godišnje izvješće Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu

Opis dokumenta

Ovaj dokument rezultat je godišnjeg praćenja provedbe Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu

Status

Prijedlog konačnog teksta

Izvor

Dokument se temelji na mjesečnim i godišnjim izvješćima dostavljenim od strane koordinатора za provedbu programa e-Hrvatska

Datum usvajanja

Svibanj 2009.

Autorsko pravo

Ovo je javni dokument. Dopušteno je umnožavanje i raspačavanje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku, uz uvjet da je naveden izvor dokumenta

SADRŽAJ

1. SAŽETAK	3
2. PRAVNI OKVIR	6
3. CILJEVI	11
3.1. Nastavak razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture	11
3.1.1. <i>Razvoj širokopojsnog pristupa Internetu u 2008. godini</i>	16
3.2. Pretvaranje javne uprave u servis građana	18
3.3. Nastavak izgradnje informacijskog društva	41
4. PRAĆENJE RAZVOJA INFORMATIZIRANOSTI JAVNIH USLUGA NA INTERNETU	43
5. PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE	52
Prilog A - Pregled kratica	54
Prilog B - Popis koordinatora	56

1. SAŽETAK

U lipnju 2008. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu kojim se nastavlja provedba danas već sveobuhvatne i dinamične akcije za postizanje bržeg iskoraka Republike Hrvatske u informacijsko društvo. Ostvarivanje ciljeva ovog Plana temelj je za ravnomjerni i sustavni razvoj informacijskog društva kao jedne od glavnih pretpostavki za razvoj društva i gospodarstva znanja u Republici Hrvatskoj.

Ključne odrednice Plana bile su:


- nastavak izgradnje i jačanje postojeće informacijsko-komunikacijske infrastrukture,
- nastavak napora u pretvaranju javne uprave u servis građana,
- nastavak izgradnje informacijskog društva u svrhu smanjivanja digitalnog jaza.

Sukladno Planu, nositelji mjera - tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima, planirali su do kraja 2008. godine realizirati ukupno 176 mjera i aktivnosti usmjerenih na podizanje razine informatiziranosti usluga javne uprave, kako za građane, tako i za poslovne subjekte. Od tog broja, 130 je mjera bilo s planiranim rokom provedbe u 2008. godini, a 46 je trajnih mjera.

Trajne mjere predstavljaju aktivnosti koje se provode tijekom cijele godine i nisu vezane vremenskim rokovima, a radi se većinom o mjerama u čijoj provedbi sudjeluje više tijela ili mjerama koje se odnose na sva tijela javne uprave (npr. ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture, i dr.). Glavni cilj trajnih mjera usmjeren je na podizanje razine informatičke svijesti i edukacije u svim tijelima za planiranje održivih mjera kako bi se kontinuirano radilo na razvoju informacijskog društva.

Rezultati provedbe planiranih aktivnosti (Tablica 1.) prikazuju kako su tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima u 2008. godini ukupno provela 76 mjera, za 54 planirane mjere zatraženo je produljenje roka, dok se trajno provodi 46 mjera. Odnos provedenih mjera i mjera za koje je zatraženo produljenje roka provedbe prikazan je u Grafu 1. Stoga se kao zaključak nameće kako će u budućnosti biti iznimno važno projekte koji se planiraju i za koje se informacije dostavljaju Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, u sklopu izrade godišnjih planova provedbe, vezati s proračunskim pozicijama u tekućoj godini. Na taj će način biti jednostavnije utvrditi što je moguće realizirati u tekućoj godini, a jednako tako i ocijeniti uspješnost ulaganja nakon određenog razdoblja.

Graf 1. Prikaz odnosa provedenih mjera i mjera za koje je zatraženo produljenje roka provedbe



Tablica 1. Statistika provedbe mjera iz Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu

Mjere*	Ukupno	%
Provedeno	76	58
Nužno produljenje roka provedbe	54	42
Ukupno	130	100

* U statistiku nisu uključene mjere koje se provode trajno

U tablici 2. prikazana je provedba mjera po poglavljima Plana, a ukazuje na stanje provedbe u području razvoja pravnog okvira, razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture, pretvaranja javne uprave u servis građana, aktivnosti vezanih uz izgradnju informacijskog društva te praćenja provedbe i izvještavanja.

Tablica 2. Pregled provedbe mjera po poglavljima Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu

POGLAVLJE	Provedeno	Nužno produljenje roka provedbe	Trajno	UKUPNO
Pravni okvir	15	7	0	22
Nastavak razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture	6	5	11	22
Pretvaranje javne uprave u servis građana	48	40	31	119
Nastavak izgradnje informacijskog društva	4	0	0	4
Praćenje provedbe i izvještavanje	3	2	4	9
UKUPNO	76	54	46	176

Tablica 3., u nastavku, prikazuje usporednu analizu informatiziranosti javnih usluga za građane, poslovne subjekte i usluga od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku od 2005. do 2008. godine koja pokazuje kako se iz godine u godinu postiže značajan napredak u informatizaciji javnih usluga.


Tablica 3. Razina informatiziranosti javnih usluga po godinama

GODINA	Razina informatiziranosti usluga (0 – 4)					UKUPNO USLUGA
	0	1	2	3	4	
2005.	17	56	32	5	1	111
2006.	0	27	66	7	7	109
2007.	0	26	55	18	12	111
2008.	0	19	48	15	26	108

U područjima javnih usluga čija se informatizacija prati nema usluga za koje ne postoje barem osnovne informacije o procesu obavljanja usluge (razina 1). Takvih je usluga u 2008. godini bilo 19, što je značajan napredak ukoliko se napravi usporedba s 2005. godinom, u kojoj nisu bile dostupne informacije za 17 usluga (razina 0), a na razini 1 bilo je 56 usluga. No, pravi se učinci informatizacije javnih usluga vide tek na najvišim razinama jer je u 2008. godini za 15 javnih usluga bilo omogućeno interaktivno ispunjavanje formulara (razina 3), u odnosu na 5 usluga na istoj razini 2005. godine te 26 javnih usluga koje su bile u potpunosti dostupne u vidu popunjavanja formulara, autentikacije, plaćanja i isporuka potvrda, narudžbi ili nekog drugog oblika potpune usluge na mreži (razina 4), u odnosu na samo 1 uslugu na ovoj razini tri godine ranije.

Ukupan broj usluga varira kroz godine zbog izmjena zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje određeno područje.

Graf 2. Prikaz informatiziranosti javnih usluga po godinama

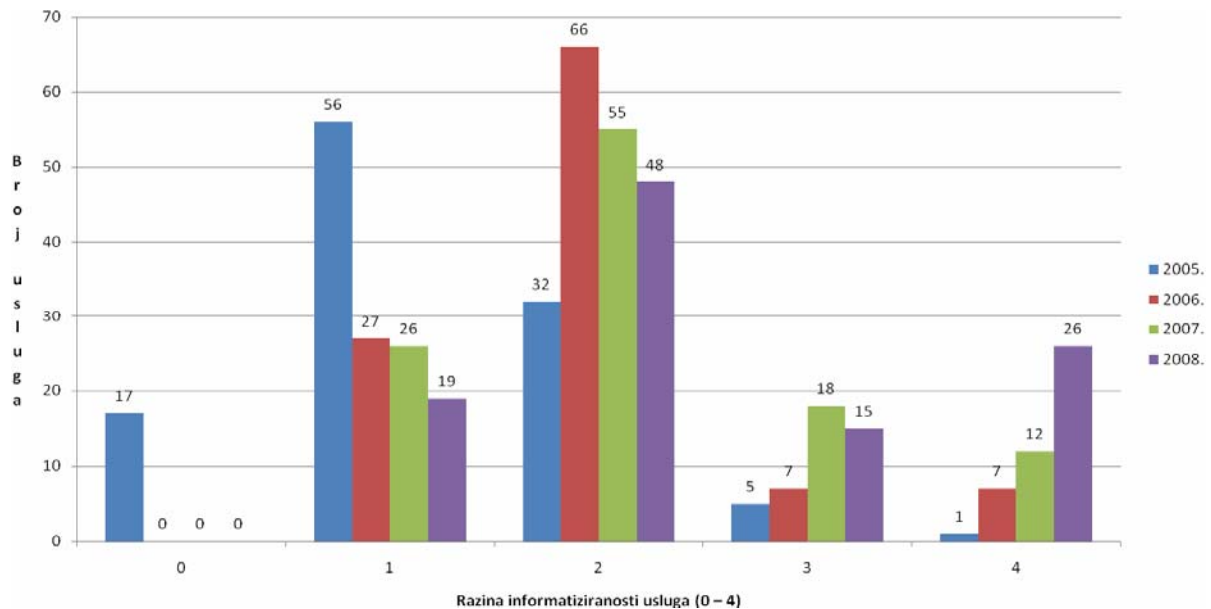

Izvor: Središnji državni ured za e-Hrvatsku, svibanj 2009.

2. PRAVNI OKVIR

Jedan od preduvjeta za razvoj informacijskog društva u Republici Hrvatskoj jest poticajan pravni okvir koji omogućava razvoj suvremenih tehnologija i njihovu primjenu u poslovanju, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Planom provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu obuhvaćena su najvažnija pravna područja za razvoj informacijskog društva (tržište telekomunikacijskih usluga, informacijske sigurnosti, regulativa vezana uz elektroničku ispravu, elektronički potpis, elektroničku trgovinu, elektroničke komunikacije, itd).

Sukladno Godišnjem izvješću, od ukupno 22 planirane mjere, na vrijeme ih je provedeno 15, dok je za 7 mjera istaknuto nužno produljenje roka provedbe.

Provedba planiranih aktivnosti

Pravni okvir				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
30101	Izrada Prijedloga uredbe o mjerama informacijske sigurnosti kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Uredba donesena i objavljena u Narodnim novinama (NN 46/08) od 23. travnja 2008. godine.				
30102	Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima sigurnosne provjere kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Pravilnik je usvojen u svibnju 2008. godine, označen oznakom NEKLASIFICIRANO te se neće objavljivati, već će biti dostavljen tijelima državne uprave.				
30103	Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima fizičke sigurnosti kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Pravilnik je usvojen u svibnju 2008. godine, označen oznakom NEKLASIFICIRANO te se neće objavljivati, već će biti dostavljen tijelima državne uprave.				
30104	Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima sigurnosti podataka kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Pravilnik je usvojen u svibnju 2008. godine, označen oznakom NEKLASIFICIRANO te se neće objavljivati, već će biti dostavljen tijelima državne uprave.				

30105	Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima sigurnosti poslovne suradnje kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Pravilnik je usvojen u svibnju 2008. godine, označen oznakom NEKLASIFICIRANO te se neće objavljivati, već će biti dostavljen tijelima državne uprave.				
30106	Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava kao podzakonskog akta Zakona o informacijskoj sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba: Pravilnik je usvojen u svibnju 2008. godine, označen oznakom NEKLASIFICIRANO te se neće objavljivati, već će biti dostavljen tijelima državne uprave.				
30107	Usvajanje Zakona o osobnom identifikacijskom broju	05-2008	MFIN PU	Provedeno
Provedba: Zakon je usvojen na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 9. svibnja 2008., a objavljen je u Narodnim novinama (NN 60/08) od 28. svibnja 2008. godine.				
30108	Izrada Nacrta prijedloga Zakona o Registru poslovnih subjekata	05-2008	MP, FINA, DZS	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine, a predlaže se i promjena nositelja provedbe na MINGORP. Nacrt Zakona je u studenom 2007. godine predstavljen na zajedničkom sastanku s predstavnicima MINGORP-a, MP-a i Trgovačkog suda u Zagrebu koji je organizirao SDUeH. Nakon ovog sastanka, 22. siječnja 2008. godine održan je i drugi sastanak u istom sastavu na kome je zaključeno da predstavljeni nacrt Zakona može poslužiti kao temelj za njegovo preciznije definiranje. Očekuje se kako će se rad radne skupine formalizirati kroz odgovarajuće odluke, kako bi se precizno definirale uloge i zadaće u izradi nacrta ovoga zakona.				
30109	Uputiti u proceduru Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu kojim se navedeni Zakon u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom EU	05-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 2. srpnja 2008., a objavljen je u Narodnim novinama (NN 80/08) od 11. srpnja 2008. godine.				
30110	Uputiti u proceduru Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini kojim se navedeni Zakon u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom EU	05-2008	MINGORP	Provedeno

Provedba:				
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 30. svibnja 2008., a objavljen je u Narodnim novinama (NN 67/08) od 9. lipnja 2008. godine.				
30111	Regulirati pravo puta u Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama na načelima transparentnosti i nediskriminacije	06-2008	MMPI	Provedeno
Provedba:				
Uređuje se člancima 27., 28. i 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2008. godine.				
30112	Ugraditi u Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama odredbu da prigodom građenja poslovne ili stambene zgrade namijenjene daljnjoj prodaji, investitor te zgrade mora izgraditi takvu infrastrukturu koja omogućava korisnicima usluga slobodan izbor operatora i ravnopravan pristup svih operatora do zgrade	06-2008	MMPI	Provedeno
Provedba:				
Uređuje se člankom 24. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2008. godine.				
30113	Provedba analize stanja propisa i prakse u vezi zaštite prava potrošača širokopoljnih (i drugih telekomunikacijskih) usluga pred zloporabama te poduzimanje eventualno potrebnih mjera	06-2008	MMPI	Provedeno
Provedba:				
U sklopu programa PHARE 2005, kroz projekt "Jačanje kapaciteta Uprave elektroničkih komunikacija i pošte kroz potporu u pripremanju prijedloga podzakonskih propisa posebno u području zaštite potrošača i provođenju najbolje prakse EU u ovom području", osigurana je tehnička pomoć konzultanata iz Europske unije pri izradi podzakonskih propisa u skladu s najboljom praksom EU iz područja zaštite prava potrošača, a ta praksa je ugrađena i u Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08).				
30114	Izrada Nacrta prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektroničkom potpisu	06-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba:				
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 2. srpnja 2008., a objavljen je u Narodnim novinama (NN 80/08) od 11. srpnja 2008. godine.				
30115	Izrada Nacrta prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektroničkoj trgovini	06-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba:				
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 30. svibnja 2008., a objavljen je u Narodnim novinama (NN 67/08) od 9. lipnja 2008. godine.				

30116	Uskladiti propise koji uređuju osnivanje poslovnih subjekata i propise o elektroničkom potpisu tako da kratki naziv poslovnog subjekta sadrži do 50 znakova	06-2008	MINGORP, MP, SDUU	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: U tijeku je izrada Pravilnika navedenog u mjeri 30117 u okviru kojeg će se riješiti problem kratkog naziva subjekta za obrtni registar. Provedba mjere očekuje se tijekom 2009. godine.				
30117	Dopuniti odgovarajući pravilnik o obrtnom registru definicijama XML shema podatkovnih struktura obrta i virtualnog dosjea obrtnika	06-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: U tijeku je izrada novog Pravilnika kojim će se, osim odredbi o definicijama XML shema podatkovnih struktura obrta i virtualnog dosjea obrtnika iz ove mjere, obuhvatiti i rješavanje problema kratkog naziva subjekta iz prethodne mjere (30116) te ostalo što je potrebno riješiti predmetnim Pravilnikom. Provedba mjere očekuje se tijekom 2009. godine.				
30118	Donijeti pravilnik koji utvrđuje tehnička pravila za osiguravanje povezanosti evidencija izdanih i opozvanih certifikata davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj	10-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu u tijeku je donošenje podzakonskih akata kojima će se uskladiti već postojeći podzakonski propisi s donijetim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu. U sklopu navedenih izmjena donijeti će se i odredbe sukladno navedenoj mjeri. Provedba mjere očekuje se tijekom 2009. godine.				
30119	Izrada Nacrta prijedloga Zakona o općem upravnom postupku	09-2008	SDUU	Provedeno
Provedba: Zakon o općem upravnom postupku je bio u prvom čitanju u Saboru, trenutno se radi se na traženim izmjenama.				
30120	Utvrđivanje zakonskih, tehničkih i financijskih preuvjeta za provođenje projekta eOsobna iskaznica	11-2008	MUP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009

Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o osnivanju Povjerenstva za pripremu Projekta eOsobna iskaznica osnovala Povjerenstvo u koje su uz članove iz drugih tijela državne uprave imenovani predstavnici MUP-a. Trenutno je prioritet uvođenje biometrijske ePutovnice te bi odmah po pokretanju projekta za biometrijsku ePutovnicu Radna skupina za izradu nacrta projekta eOsobne iskaznice trebala nastaviti s radom. Trenutno se zna da osobna iskaznica mora biti u skladu s EU regulativom i poštivati standarde za „identity card“ koje je propisala EU. Također, odustalo se od objedinjavanja vozačke dozvole i osobne iskaznice u jednu karticu upravo zbog EU regulative koja ima različite standarde (čak što više, potpuno suprotne) za jedan i drugi dokument. Ono što je sigurno, nova osobna će imati isti čip kao i putovnica te će se ujedno naslanjati na jedan dio PKI infrastrukture koja će se graditi za biometrijsku ePutovnicu. Postojeća PKI infrastruktura biti će nadograđena određenim modulima.				
30121	Izrada Prijedloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o upravljanju HITRONet-om	12-2008	SDUeH	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok - 12/2009
Provedba:				
U tijeku je evaluacija postojećih akata Vlade Republike Hrvatske o upravljanju HITRONetom, nakon čega će se izraditi novi prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o upravljanju HITRONetom.				
30122	Izrada Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti	12-2008	FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Fina može predlagati izmjenu Zakona o NKD-u tek kada bude donesen novi Zakon o RPS-u kojim FINA postaje nositelj RPS-a.				

3. CILJEVI

3.1. Nastavak razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture

Za uspješan razvoj informacijskog društva neophodno je osigurati stabilnu i sigurnu infrastrukturu. Stoga su i tijekom 2008. godine nastavljeni naponi Vlade Republike Hrvatske prema osnaživanju postojeće i izgradnji nove informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Pritom se posebno potiče daljnji razvoj širokopojasne pristupa, proces prelaska s analognog na digitalno emitiranje radijskog i televizijskog programa, nastavak povezivanja tijela državne uprave u mrežu HITRONet te nastavak izgradnje pravnog okvira za osiguranje informacijske sigurnosti. Od ukupno 22 planirane mjere, 6 mjera provedeno je u roku, za 5 mjera naznačena je nužnost produljenja roka provedbe, a 11 mjera trajno se provodi.

Provedba planiranih aktivnosti

Telekomunikacije – širokopojasni pristup				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50101	Provedba Natječaja za dodjelu općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi i brdsko planinskim područjima	12-2008	HAKOM	Provedeno
Provedba: Natječaj proveden. Broj priključaka realiziranih temeljem dodjele općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu iznosio je 14 257 do kraja 2008. godine.				
50102	Objava prijedloga Standardne ponude za međupovezivanje operatora sa znatnijom tržišnom snagom	12-2008	HAKOM	Provedeno
Provedba: Prijedlog Standardne ponude za međupovezivanje operatora sa znatnijom tržišnom snagom objavljen u roku. Vidi: www.telekom.hr .				
50103	Poticanje razvoja širokopojasnih sadržaja i usluga	trajno	MMPI, MK, SDUeH	U tijeku
Provedba: Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. lipnja 2008. godine o iznosu i načinu raspodjele viška sredstava koji čini razlika između prihoda i rashoda HAKOM-a, ostvarenih u 2007. godini, osigurana su sredstva za daljnje poticanje razvoja širokopojasnih sadržaja i usluga.				

50104	Sudjelovanje u radu stručne skupine za Inicijativu regionalnog razvitka širokopojsnog pristupa internetu (bSEE - Broadband South East Europe) - inicijativa u okviru Vijeća za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council - RCC)	trajno	MMPI	U tijeku
Provedba: MMPI kontinuirano sudjeluje u radu stručne skupine za Inicijativu regionalnog razvitka širokopojsnog pristupa internetu (bSEE -Broadband South East Europe). U 2008. godini održana su 3 sastanka: 21. veljače u Bruxelles-u, 24. lipnja u Cavtatu te 27. i 28. listopada u Sarajevu.				
50105	Praćenje statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnih usluga te objavljivanje podataka na internetskoj stranici Hrvatske agencije za telekomunikacije	trajno	HAKOM	U tijeku
Provedba: Aktivnost se kontinuirano provodi.				
50106	Redovito objavljivanje statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnih usluga	trajno	DZS	U tijeku
Provedba: Aktivnost se kontinuirano provodi.				
50107	Aktivno sudjelovanje u međunarodnim telekomunikacijskim organizacijama (ITU, CEPT, ETSI, itd.)	trajno	MMPI, HAKOM	U tijeku
Provedba: Predstavnici MMPI-a i HAKOM-a aktivno prate i sudjeluju u radu tijela i radnih skupina Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) te kao promatrači u radu Odbora za komunikacije Europske komisije (COCOM). Također sudjeluju na redovitim sastancima visokih predstavnika nacionalnih uprava za elektroničke komunikacije.				
Digitalna televizija				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50201	Izrada Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj	07-2008	MMPI, MK, HAKOM, VEM	Provedeno

Provedba:				
Vlada Republike Hrvatske je 31. srpnja 2008. godine Zaključkom prihvatila Strategiju prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj. Također, na istoj sjednici je donijeta Odluka o početku digitalnog emitiranja i prestanku analognog emitiranja televizijskih programa u Republici Hrvatskoj i Odluka o načinu raspodjele sredstava te kriterijima i mjerilima za davanje potpore fizičkim osobama koje plaćaju radijsku i televizijsku pristojbu, prigodom nabave uređaja za prijam digitalnih zemaljskih televizijskih signala u Republici Hrvatskoj.				
50202	Priprema prijedloga Akcijskog plana provedbe Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj	07-2008	MMPI, MK, HAKOM, VEM	Provedeno
Provedba:				
Akcijski plan prelaska s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje televizijskih programa po digitalnim regijama izrađen kao sastavni dio Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj.				
50203	Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima u vezi s digitalnom televizijom	trajno	MMPI, MK, HAKOM, VEM	U tijeku
Provedba:				
MMPI, u suradnji s HAKOM, aktivno i kontinuirano sudjeluje u aktivnostima vezano uz prelazak na digitalnu televiziju. Predstavnici MMPI-a i HAKOM-a sudjelovali su na sastancima Radne skupine za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom (WGFM) stalnog radnog tijela Odbora za elektroničke komunikacije (ECC) u okviru CEPT-a, održanog u Ateni od 11. do 15. veljače 2008. godine. Predstavnici HAKOM-a sudjelovali su na tri radna sastanka ECC TG4 radne skupine koja se bavi tehničkim aspektima „digitalne dividende”, s naglaskom na koegzistenciju radiokomunikacijskih mreža različitih gustoća (mobilne i radiodifuzijske) u VHF i UHF području.				
HITRONet				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50301	Uspostava Odjeljka HITRONet u SDUeH	12-2008	SDUeH	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku. Provedba mjere razmotrit će se tijekom 2009. godine.				
50302	Uspostava točke prisutnosti sTESTA u HITRONet-u	12-2008	SDUeH, FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009

Provedba:				
<p>Mjera nije provedena u planiranom roku jer nije postojala potreba za povezivanjem. Potreba će se pojaviti uspostavljanjem elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj unutar koji će biti potrebno uspostaviti prekograničnu razmjenu podataka. Prva takva usluga je TAHONet. Tijekom 2009. godine planira se završiti spajanje na sTESTA mrežu u okviru uspostavljanja prve prekogranične usluge TAHONet. No, u međuvremenu su odrađene sve potrebne predradnje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31. siječnja 2008. godine poslan je zahtjev za udomljavanjem opreme za sTESTA mrežu u Ministarstvu financija. • 21. ožujka 2008. godine poslana je zamolba za spajanjem Misiji Europske Unije pri Europskim zajednicama. 				
50303	Povezivanje TDU u HITRONet	trajno	SDUeH, FINA, DZM	U tijeku
Provedba:				
<p>U razdoblju od 1. studenog 2007. do 31. ožujka 2008. godine izvršeno je povezivanje 141 institucije MP-a (sudovi) na 67 lokacija u Republici Hrvatskoj na HITRONet, pri čemu je uspostavljena jedinstvena računalno-komunikacijska mreža ePravosuđa koja se koristi posebice za sustav eSpis. Projekt je uspješno završen u planiranim vremenskim okvirima i u planiranom opsegu. Detaljna izvješća dostavljena su SDUeH i MP-u. U prosincu 2008. provedeno je dodatno proširenje mreže SDUU na 16 novih matičnih ureda u Dubrovačkoj županiji i 3 lokacije u Zagrebačkoj županiji. U prosincu 2008. godine je također provedeno povezivanje MP-a, SDUU-a, DZS-a i MUP-a na APIS IT zbog potreba projekta osobnog identifikacijskog broja.</p>				
Informacijska sigurnost				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50401	Određivanje koordinatora u tijelima za izradu vlastitih programa informacijske sigurnosti	05-2008	UVNS	Provedeno
Provedba:				
<p>Određeni su koordinatori u tijelima državne uprave. UVNS je organizirao rad međuresorne koordinacije za sigurnosna pitanja u procesu pristupa Republike Hrvatske NATO-u, a nastavit će se u ostalim tijelima državne uprave u okviru dostave prethodno navedenih pet pravilnika informacijske sigurnosti.</p>				
50402	Izrada Web stranice ZSIS-a – informacije iz područja informacijske sigurnosti dostupne cjelokupnom građanstvu i poslovnom sektoru s ciljem razvoja sigurnosne svijesti	12-2008	ZSIS	Provedeno
Provedba:				
<p>Izrada Web stranice provedena je sukladno roku provedbe. Vidi: http://www.zsis.hr/</p>				
50403	Izrada Web servisa za registrirane korisnike – informacije vezane uz usluge koje će ZSIS pružati tijelima državne uprave a vezano uz koordinaciju aktivnosti kod odgovora na računalne sigurnosne incidente s potrebnim formularima u elektroničkom obliku	12-2008	ZSIS	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009


Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Izrada Web servisa za registrirane korisnike je u tijeku. Provedba se očekuje tijekom 2009. godine				
50404	Izrada preporuka za uvođenje sigurnosnih standarda IT opreme u okviru javne nabave u Republici Hrvatskoj	12-2008	UVNS, ZSIS, SDUeH, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. UVNS obavio koordinaciju s MINGORP-om vezano uz izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi.				
50405	Izrada prijedloga programskih sadržaja informacijske sigurnosti koje treba uključiti u državni stručni ispit	12-2008	UVNS, ZSIS, SDUU	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
50406	Koordinirati usklađivanje rada svih tijela u Republici Hrvatskoj nadležnih za poslove informacijske sigurnosti sukladno zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o sustavu informacijske sigurnosti, izvještavanje i upoznavanje tijela s novom regulativom, odrediti koordinate u tijelima za izradu vlastitih programa informacijske sigurnosti te formirati odgovarajuća koordinacijska radna tijela	trajno	UVNS	U tijeku
Provedba: Koordinacija se provodi kroz nekoliko aktivnosti: koordinaciju implementacije mjera i standarda u državnim tijelima, koordinaciju ustrojavanja Registara u državnim tijelima za prijem i distribuciju klasificiranih podataka te davanje uputa za imenovanje savjetnika za informacijsku sigurnost i sigurnosnih koordinatora.				
50407	Razvijati sigurnosnu svijest i programe edukacije u području informacijske sigurnosti za sva tijela i pravne osobe koje su obveznici provedbe Zakona o tajnosti podataka i Zakona o informacijskoj sigurnosti, koncipiranje početnih programa	trajno	UVNS	U tijeku
Provedba: Provedena edukacija savjetnika za informacijsku sigurnost i sigurnosnih koordinatora u državnim tijelima o provedbi mjera i standarda informacijske sigurnosti.				
50408	Praćenje projekta HITRONet sa sigurnosnog aspekta, izrada polugodišnjih sigurnosnih preporuka te analiza njihove provedbe s nositeljima projekta HITRONet	trajno	UVNS, ZSIS, CARNet	U tijeku

Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
50409	Izrada brošura, Web stranica i održavanje seminara za državna tijela s ciljem razvoja sigurnosne svijesti u državnoj upravi te u svrhu razumijevanja procesa informacijske sigurnosti koji se odvijaju u državnoj upravi, u okviru poslovnog sektora i građanstva (naročito problematika NATO i EU integracija)	trajno	UVNS, ZSIS	U tijeku
Provedba: Aktivnost se kontinuirano provodi. Izrada Web stranice u tijeku.				

3.1.1. Razvoj širokopojasnog pristupa Internetu u 2008. godini

Kada govorimo o razvoju širokopojasnog pristupa Internetu, u 2008. godini poseban je naglasak stavljen na daljnje povećanje broja korisnika širokopojasnog pristupa Internetu te daljnji razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima. Prema službenim podacima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, na kraju 2008. godine u Republici Hrvatskoj bilo je 683 207 priključaka širokopojasnog pristupa Internetu. S obzirom na ukupan procijenjeni broj stanovnika za 2008. godinu prosječna gustoća iznosila je 15,4 %.

Graf 3. Ukupan broj korisnika širokopojasnog pristupa internetu u 2008. godini

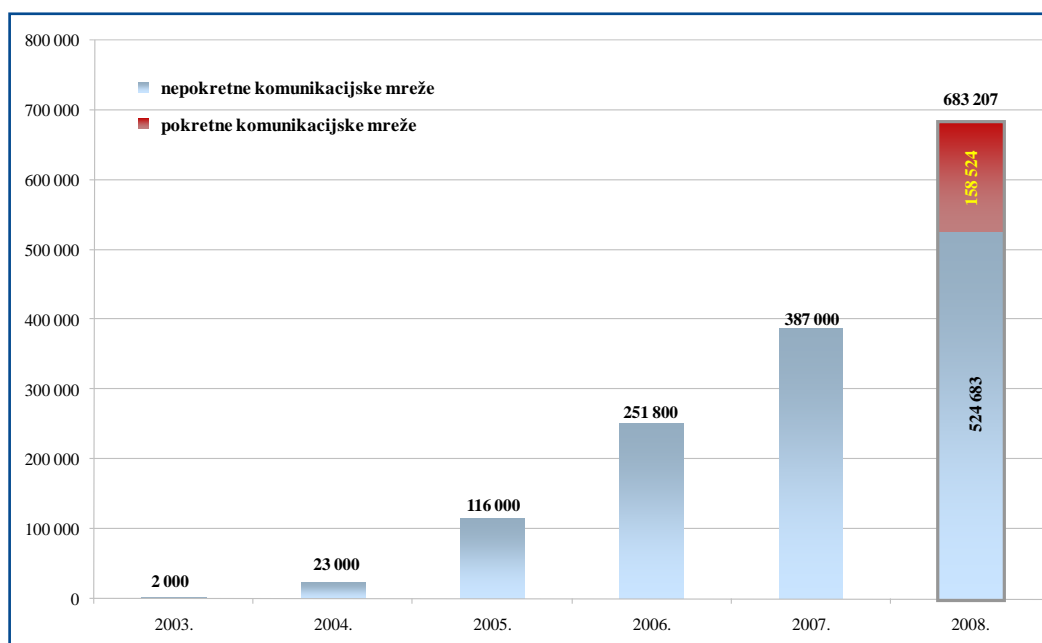


Izvor: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, veljača 2009.

Na dan 31. prosinca 2008. godine u Republici Hrvatskoj bilo je 524 683 priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretnih mreža. S obzirom na ukupan procijenjeni broj stanovnika za 2008. godinu, prosječna gustoća iznosila je 11,83 %. Ukupan broj širokopojasnih priključaka putem pokretnih mreža u isto vrijeme iznosio je 158 524. S obzirom na ukupan procijenjeni broj stanovnika za 2008. godinu, prosječna gustoća iznosila je 3,57 %.

Pogledamo li regionalnu zastupljenost širokopojasnog pristupa internetu, vidljiva je velika razlika u broju i gustoći priključaka po županijama. Najveća koncentracija priključaka nalazi se u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, potom u Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Najmanja koncentracija nalazi se u sjevernom djelu Republike Hrvatske i to u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija nalaze se blizu prosjeka.

Slika 1. *Gustoća širokopojasnih priključaka po županijama Republike Hrvatske na kraju 2008. godine*

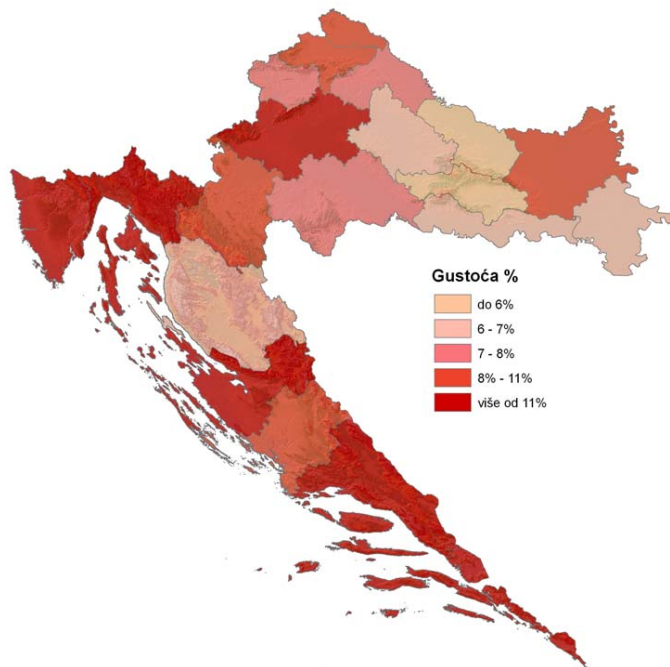

Izvor: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, veljača 2009.

Tablica 4. *Gustoća širokopojasnih priključaka po županijama Republike Hrvatske na kraju 2008. godine*

Županije	Gustoća u odnosu na broj stanovnika	Županije	Gustoća u odnosu na broj stanovnika
Virovitičko-podravska županija	5,49 %	Varaždinska županija	8,29 %
Požeško-slavonska županija	5,65 %	Osječko-baranjska županija	8,53 %
Brodsko-posavska županija	6,20 %	Šibensko-kninska županija	9,07 %
Bjelovarsko-bilogorska	6,53 %	Međimurska županija	9,07 %

županija			
Vukovarsko-srijemska županija	6,41 %	Zadarska županija	11,04 %
Ličko-senjska županija	6,84 %	Splitsko-dalmatinska županija	11,81 %
Koprivničko-križevačka županija	7,14 %	Dubrovačko-neretvanska županija	14,30 %
Sisačko-moslavačka županija	7,26 %	Istarska županija	14,78 %
Krapinsko-zagorska županija	7,94 %	Primorsko-goranska županija	16,05 %
Karlovačka županija	8,35 %	Grad Zagreb i Zagrebačka županija	18,25 %

Izvor: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, veljača 2009.

Broj priključaka na kraju 2008. godine prijavljenih na fizičku osobu iznosio je 407 966, dok je broj priključaka prijavljenih na pravnu osobu 116 717, što pokazuje da je ipak većina širokopojasnog pristupa internetu vezana uz kućanstva.

Usporedimo li razvoj širokopojasnih priključaka u Republici Hrvatskoj u odnosu na onaj u Europskoj uniji vidljiv je izrazit pomak u 2008. godini. Naime, na kraju 2007. godine gustoća u Republici Hrvatskoj iznosila je 8,72%, a gustoća u Europskoj uniji iznosila je 20,00%. Polovicom 2008. godine gustoća u Republici Hrvatskoj iznosila je 10,18%, dok je u Europskoj uniji iznosila 21,70%. To znači da je u prvih 6 mjeseci 2008. godine Republika Hrvatska ostvarila porast od 16,74%, dok je u EU porast iznosio 8,5%. Na kraju trećeg tromjesečja gustoća u Republici Hrvatskoj iznosila je 11,01 %. Usporedbom podataka gustoće za 2007. i 2008. godinu vidljiv je pozitivan pomak u 2008. godini, tako da je Republika Hrvatska ostvarila pomak u ukupnom poretku zemalja Europske unije.

3.2. Pretvaranje javne uprave u servis građana

Osnovna ideja transformacije hrvatske javne uprave jest približiti upravu građanima, učiniti je transparentnijom i dostupnijom. U tu svrhu potrebno je osmisliti i ponuditi građanima i poduzetnicima što više usluga koje bi bile dostupne putem Interneta te osigurati dostupnost usluga javne uprave svim korisnicima neovisno o njihovim mogućnostima, znanju i eventualnim ograničenjima. Identitet nove javne uprave u Republici Hrvatskoj kakvu gradimo je servis građana dostupan putem modernih, tehnološki podržanih komunikacijskih kanala 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu cijele godine.

U 2008. godini, na području informatizacije javne uprave planirana je provedba od ukupno 119 mjere. Sukladno Godišnjem izvješću, na vrijeme je provedeno 48 mjera, za 40 mjera naznačeno je nužno produljenje roka provedbe, dok se trajno provodi 31 mjera.

U okviru ovog poglavlja bile su planirane i mjere koje se odnose na aktivnosti planirane u 2008. godini za daljnji razvoj Središnjeg portala javne uprave – Moja uprava, koji je Vlada Republike Hrvatske uspostavila 2007. godine u cilju izgradnje jedinstvenog sučelja za komunikaciju građana, gospodarskih subjekata i tijela državne uprave. Sve aktivnosti vezane za daljnji razvoj Središnjeg portala javne uprave

– Moja uprava, pa tako i aktivnosti planirane u 2008. godini, odvijat će se u skladu sa Strategijom razvoja elektroničke uprave za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

Provedba planiranih aktivnosti

eUprava				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50501	Uspostava informacijskog sustava za upravljanje sigurnošću (<i>Information Security Managment Systems - ISMS</i>) u području produkcije i finalizacije dokumenata	05-2008	APIS IT	Provedeno
Provedba: Prvi certifijski postupak obavljen, drugi je planiran tijekom 2009. godine.				
50502	Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom na graničnim prijelazima: Županja, Stara Gradiška, Karasovići, Zračna luka Split, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Gunja – faza 2	05-2008	MUP	Provedeno
Provedba: Projekt je u provedbenom smislu završen i sustav je u funkciji na graničnim prijelazima. MUP i SAFU potpisali su krajem prosinca 2008. godine „Provisional Acceptance Certificate“.				
50503	Digitalizacija tekstova međunarodnih ugovora koji nisu online dostupni – 1. faza: izraditi liste važećih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske koji nisu dostupni online	05-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: Dvršena 1. faza digitalizacije tekstova međunarodnih ugovora – izrađene liste važećih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske koji nisu online dostupni.				
50504	Priprema za prijenos vođenja Registra poslovnih subjekata u Financijsku agenciju (migracija podataka iz DZS)	06-2008	FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Provedba je vezana uz provedbu mjere 30108 - <i>Izrada Nacrta prijedloga Zakona o Registru poslovnih subjekata</i> , a očekuje se tijekom 2009. godine.				
50505	Slanje obavijesti o razvrstavanju jedinica Registra poslovnih subjekata (RPS) prema NKD 2007	06-2008	DZS	Provedeno

Provedba: Zaključno s 31. prosinca 2008. godine, poslana su sve obavijesti o razvrstavanju jedinica Registra poslovnih subjekata (RPS) prema NKD 2007.				
50506	Dovršavanje instalacije modula za pretraživanje DAMIR-a po punom tekstu sadržaja	06-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: Dovršavanjem instalacije modula za pretraživanje po punom tekstu sadržaja, DAMIR je pretraživ po punom tekstu te omogućuje trajni pristup objavljenoj elektroničkoj dokumentaciji tijela javne vlasti Republike Hrvatske s jednog mjesta. Vidi: http://www.hidra.hr/trazi/trazi.htm .				
50507	Usklađenje i certifikacija ISMS područja produkcije i finalizacije dokumenata APIS IT-a sa ISO/IEC 27001	07-2008	APIS IT	Provedeno
Provedba: Prvi certifijski postupak obavljen, drugi se očekuje tijekom 2009. godine.				
50508	Izrada Strategije razvoja eUprave	09-2008	SDUeH	Provedeno
Provedba: Strategija razvoja elektroničke uprave za razdoblje od 2009. do 2012. godine usvojena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 22. siječnja 2009. godine.				
50509	Digitalizacija tekstova međunarodnih ugovora koji nisu online dostupni - 2. faza: digitalizacija tekstova ugovora	09-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: 2. faza digitalizacije tekstova međunarodnih ugovora koji nisu online dostupni uspješno provedena.				
50510	Uspostava servisa za pretraživanje Eurovoca obogaćenog asocijatima – testna verzija	09-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: Testiranje je dovelo do promjene koncepta. Umjesto pretraživanja tekstova posredno pretraživanjem Eurovoca pomoću pridruženih statističkih asocijata, radi se na redizajnu modela podataka baze službene dokumentacije Republike Hrvatske i programske infrastrukture za izravno pretraživanje tekstova pomoću Eurovoca i deskriptorima pridruženih statističkih asocijata.				
50511	Instalirati eksperimentalne verzije automatskog indeksatora WebAIDE koji je namijenjen indeksiranju propisa Republike Hrvatske na izvoru njihova nastanka	09-2008	HIDRA	Provedeno

Provedba: Eksperimentalne verzije automatskog indeksatora WebAIDE instalirane su u predviđenom roku. Vidi: http://hidra.srce.hr:8080/eCadis/eCadis.jsp .				
50512	Instaliranje, lokaliziranje, usklađivanje mjera sigurnosti te primjena verzije 3.0 kolaboracijski sustav za projekte unutar sustava javne uprave CIRCA	09-2008	SDUeH, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Budući da na razini Europske unije nije objavljena verzija 3.0, mjera se odgađa do objave. Provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
50513	Digitalizacija tekstova međunarodnih ugovora koji nisu online dostupni - 3. faza: pohrana u digitalni arhiv HIDRA-e (DAMIR) i uključivanje u eKatalog službene dokumentacije Republike Hrvatske	10-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: 3. faza digitalizacije tekstova međunarodnih ugovora koji nisu online dostupni uspješno provedena. Vidi: http://www.hidra.hr/dok/1katalog.htm .				
50514	Usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave COP i HRM TDU	11-2008	MFIN, SDUU, FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Zbog kadrovskih promjena ključnih sudionika u projektu, nužno je imenovanje nove uprave projekta i projektnog tima. Navedene aktivnosti su u tijeku kao i razrada ugovora s Finom.				
50515	Izgraditi moderni Web/Portal i informirati korisnike o stanju na telekomunikacijskom tržištu	12-2008	HAKOM	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
50516	Podizanje razine interoperabilnosti WEB stranice objavom obrazaca u interaktivnoj formi (spremanje i ispunjavanje na računalu) i priprema za prihvat obrazaca uz autentifikaciju.	12-2008	DZM	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Izrada nove verzije web stranice i interaktivnih obrazaca je u tijeku.				

50517	Izrada podloge i obavljanje pripremnih radova na organiziranju informatičkih baza DZM-a	12-2008	DZM	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Izrada podloge i obavljanje pripremnih radova na organiziranju informatičkih baza DZM-a pri završetku. Provedba mjere očekuje tijekom 2009. godine.				
50518	Revidiranje podataka eKataloga službene dokumentacije Republike Hrvatske (reorganizacija zbirke u formalne pod zbirke, ujednačavanje formalne i sadržajne obrade jedinica, klasifikacija po područjima djelatnosti tijela javne vlasti)	12-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: Revidiranje podataka eKataloga službene dokumentacije Republike Hrvatske provedeno u roku. Vidi: http://www.hidra.hr/dok/1katalog.htm .				
50519	Izrada procedure za automatsko prikupljanje terminologije po područjima djelatnosti tijela javne vlasti (1. faza: Prikupljanje novinskih članaka iz područja energetike i ekologije (oko 1000 tekstova mjesečno), 2. faza: Razvoj programa za obradu tekstova u svrhu ekstrakcije terminologije (TERMEX))	12-2008	HIDRA	Provedeno
Provedba: Prikupljanje se provodilo tijekom cijele godine, a svi članci prikupljeni zaključno s krajem lipnja konvertirani su u XML format (7411 tekstova). Ostatak tekstova će se konvertirati ako eksperimenti na konvertiranim tekstovima pokažu pozitivne rezultate u prikupljanju terminologije iz spomenutih područja. U suradnji s FER-om napravljen je program TermeX - alat za automatsku ekstrakciju kolokacija i izradu terminoloških leksikona.				
50520	Provedba projekata provedbe istraživanja o informacijskom društvu (IKT-a) za 2008. u okviru PHARE Multi-Beneficiary Statistical Co-operation Programme 2006 (3 projekta)	12-2008	DZS	Provedeno
Provedba: Projekti provedbe istraživanja o informacijskom društvu (IKT-a) za 2008. u okviru <i>PHARE Multi-Beneficiary Statistical Co-operation Programme 2006</i> provedeni sukladno roku provedbe.				
50521	Povezati Očevidnik državne imovine s referentnim bazama podataka koje su u nadležnosti Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa	12-2008	SDUUDI, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Povezivanje Očevidnika će se uspostaviti po završetku ZIS-a (Zajedničkog informacijskog sustava MP-a i DGU-a).				

50522	Izrada protokola za nadogradnju Očevidnika državne imovine	12-2008	SDUUDI	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Izrada protokola za nadogradnju Očevidnika je u tijeku.				
50523	Izrada analize državne imovine i predložka za ocjenjivanje svake jedinice imovine	12-2008	SDUUDI	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Izrada analize državne imovine i predložka za ocjenjivanje svake jedinice imovine je u tijeku.				
50524	Provedba projekta Informatizacije upisnika/registara i dizajniranje cjelovitih informacijskih sustava u MPRRR – 2. faza: Dizajniranje i implementacija Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava.	12-2008	MPRRR	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2010
Provedba Mjera nije provedena u planiranom roku. Rok provedbe prenosi se na prosinac 2010. godine.				
50525	Nadogradnja i prilagodba informacijskog sustava i poslovnog sustava APIS IT-a, uspostava tehničke infrastrukture za interoperabilnost sustava za nadzor poslovnih procesa i sustava za upravljanje rizicima	12-2008	APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – trajno
Provedba: Predviđeno je da faza 1 bude gotova u proljeće 2009. godine. No, nadogradnja i prilagodba se planira raditi kontinuirano u narednim periodima. Zbog tijeka razvoja predlaže se promjena naziva mjere u „Prilagodba nacionalnih informacijskih sustava zahtjevima EU i izgradnja tehničke infrastrukture za EU interoperabilnost i interkonektivnost. S obzirom da je ovo trajna mjera predlaže se da se rok provedbe prevede u „trajno“.				
50526	Uparivanje podataka u elektroničkoj Knjizi državljana	12-2008	SDUU	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok - 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
50527	Standardiziranje elektroničkih sustava za upravljanje zapisima u državnoj upravi prema Modelu zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima MoReq2 (Model Requirements for Electronic Records Management)	12-2008	SDUeH, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009

Provedba: Provedba aktivnosti predviđena je unutar Strategije razvoja elektroničke uprave za razdoblje 2009. do 2012. godine.				
50528	Uspostava sustava za elektroničko dostavljanje ponuda u postupcima javnih nabava (eTendering)	12-2008	MINGORP, NN, FINA	Provedeno ¹
Provedba: Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisane su odredbe vezane uz elektroničko poslovanje u postupcima javne nabave te je njime, sa stajališta javne nabave, u potpunosti omogućena „eNabava“. Zakonom su, među ostalim, propisane odredbe o elektroničkom dostavljanju ponuda te zahtjevi za uređaje putem kojih se provode postupci eNabave. U skladu s razvojem ostalih elemenata kojima se uređuje ePoslovanje (npr. mogućnost dobivanja svih potrebnih dokaza o sposobnosti u elektroničkom obliku), naručiteljima je omogućen odabir korištenja elektroničkih sredstava u postupcima javne nabave.				
50529	Uspostava sustav za elektroničku dražbu kao zasebnog, cjelokupnog elektroničkog načina nabave	12-2008	MINGORP, NN, FINA	Provedeno
Provedba: Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisane su odredbe vezane uz elektroničko poslovanje u postupcima javne nabave te je njime, sa stajališta javne nabave, u potpunosti omogućena „eNabava“. Zakonom su, među ostalim, propisane odredbe o u potpunosti elektroničkim postupcima javne nabave, a to su elektronička dražba i dinamički sustav nabave. U skladu sa zakonskim odredbama koje omogućuju provedbu elektroničke dražbe, određeni gospodarski subjekti iz IT sektora na tržištu Republike Hrvatske razvili su ili su u postupku razvoja aplikacija za njenu provedbu od strane zainteresiranih naručitelja.				
50530	Uspostava sustava za eNarudžbe kao osnove za dinamički sustav nabave	12-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisane su odredbe vezane uz elektroničko poslovanje u postupcima javne nabave te je njime, sa stajališta javne nabave, u potpunosti omogućena „eNabava“. Zakonom su, među ostalim, propisane odredbe o u potpunosti elektroničkim postupcima javne nabave, a to su elektronička dražba i dinamički sustav nabave. U skladu s razvojem ostalih elemenata kojima se uređuje ePoslovanje, primjerice eNarudžbe, naručiteljima je omogućen odabir korištenja elektroničkih sredstava u postupcima javne nabave.				
50531	Uspostava sustava za eKatalog kao osnove za dinamički sustav nabave	12-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisane su odredbe vezane uz elektroničko poslovanje u postupcima javne nabave te je njime, sa stajališta javne nabave, u potpunosti omogućena „eNabava“. Zakonom				

¹ **Napomena:** Provedeno je sa stajališta Zakona o javnoj nabavi. Provedba u praksi ovisi o razvoju drugih dijelova e-poslovanja te o razvoju tržišta koje će nuditi razne aplikacije za provedbu postupaka. Iako se stiče dojam da je potrebno uspostaviti „jedan sustav“ u praksi se radi o uspostavi više sustava (temeljem Zakona, svaki naručitelj može razviti svoj sustav).

su, među ostalim, propisane odredbe o u potpunosti elektroničkim postupcima javne nabave, a to su elektronička dražba i dinamički sustav nabave. U skladu s razvojem ostalih elemenata kojima se uređuje ePoslovanje, primjerice eKataloga, naručiteljima je omogućen odabir korištenja elektroničkih sredstava u postupcima javne nabave.				
50532	Izgradnja i implementacija Jedinственог информацијског sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske – ustrojavanje internih namjenskih snaga za realizaciju projekta i ugovaranje usluge izgradnje i implementacije sustava	12-2008	MORH	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Provedena je i završena I. faza Projekta. Za 2009. godinu planirana su sredstva za realizaciju dijela Projekta (licence i ostala nematerijalna imovina te usluge razvoja programske opreme tj. softvera). Inicijalni iznos planiranih finansijskih sredstava umanjen je poradi smanjenja Državnog proračuna za 2009. godinu. Očekuje se nastavak Projekta, a njegova dinamika ovisiti će o raspoloživim sredstvima.				
50533	Izrada privremenih dokumenata u okviru 1. faze dugogodišnjeg projekta aplikacije eAgencije (ePravilnik, eKonzultacije, eSavjet, eŽalbe, eDozvole, ePonuda (GIS), eInfrastruktura (GIS), eTržište, eNatječaj)	12-2008	HAKOM	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
50534	Uspostava digitalnog radiokomunikacijskog sustava MUP-a „TETRA MUPNet“ - Instalacija preostalih 28 od ukupno 110 baznih postaja i pokrivenost sustavom cijelog teritorija Republike Hrvatske	12-2008	MUP	Provedeno
Provedba: 31. kolovoza 2008. godine instalirana je 111. bazna postaja predviđena i nabavljena „TETRA MUPNet“ projektom. Sustav je u radu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.				
50535	Izgradnja i puštanje u uporabu aktivne mreže permanentnih GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) Republike Hrvatske – CROPOS	12-2008	DGU	Provedeno
Provedba: Globalni navigacijski satelitski sustav Republike Hrvatske – CROPOS pušten u uporabu sukladno planiranom roku. Vidi: http://www.cropos.hr/ .				
50536	Proširenje i nadogradnja aplikacijskog sustava za vođenje upisnika i evidencija (eRegistri), jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva te sustava za prikupljanje podataka putem strukturiranih web obrazaca (eObrasci) koja uključuje proširenje sustava novim	trajno	MZOŠ	U tijeku

	eRegistrira - aplikacijskim rješenjem za vođenje operativnih podataka pojedinih poslovnih procesa u Ministarstvu			
Provedba:				
Aktivnosti se provode po planu. Implementiran je sustav za prikupljanje i obradu podataka putem strukturiranih web obrazaca (eObrasci) povezanih sa sustavom eRegistri. Tim putem prikupljaju se podaci za razne natječaje iz područja znanosti i obrazovanja.				
50537	Kontinuirano usklađivanje sadržaja na Internetu s WCAG 1.0	trajno	sva TDU	U tijeku
Provedba:				
U MPRRR ova se mjera provodi kroz projekt "Redizajn WEB stranice Ministarstva" za čije ostvarenje je odgovorna, od ministra imenovana radna skupina. Redizajnirana je stranica u testnoj fazi, a konačan oblik bit će dostupan javnosti do kraja srpnja 2008. godine.				
50538	Ažuriranje Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) u skladu s međunarodnom klasifikacijom NACE Rev.2 – NKD 2007	trajno	DZS	U tijeku
Provedba:				
U provedbi ove mjere doneseni su potrebni podzakonski akti: Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07); Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 80/07); Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 102/07); Izmjene i dopune za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 123/08). Daljnje usklađivanje odvijat će se po potrebi.				
50539	Izgradnja Središnjeg informacijskog sustava kategoriziranja turističkih objekata	trajno	MINT	U tijeku
Provedba:				
U 2009. godini nastavlja se implementacija sustava u uredima državne uprave u županijama.				
50540	Izgradnja Informacijskog sustava praćenja i razvoja programa poticanja u turizmu	trajno	MINT	U tijeku
Provedba:				
Izgradnja Informacijskog sustava praćenja i razvoja programa poticanja u turizmu je u tijeku.				
50541	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	trajno	sva TDU	U tijeku
Provedba:				
Aktivnosti se provode po planu. U Državnom proračunu za 2008. godinu za projekte primjene informacijske i komunikacijske tehnologije bilo je planirano 855.900.276,00 kuna.				
50542	Objavlivanje informacija o natječajima i rezultatima natječaja u okviru CIP ICT u roku od 5 dana od objave na EU portalu	trajno	SDUeH, APIS IT	U tijeku

Provedba:				
Sve aktivnosti provođene su ažurno i prema planu. Vidi: http://www.e-hrvatska.hr/cip-ict/ .				
50543	Izgradnja sustava interoperabilnosti tijela državne uprave	trajno	SDUeH, APIS IT	U tijeku
Provedba:				
Provedba ove aktivnosti predviđena je unutar Strategije razvoja elektroničke uprave za razdoblje 2009. do 2012. godine.				
50544	Ugrađivanje i održavanje informacijskih sadržaja o Open Desktop, Open Office i srodnim rješenjima te hrvatskim i međunarodnim normama na portalu e-Hrvatska	trajno	SDUeH, APIS IT	U tijeku
Provedba:				
SDUeH na svojim stranicama objavljuje obrasce u otvorenim formatima.				
50545	Izrada studije razvoja eNabave s analizom postojećeg stanja	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba:				
Uprava za sustav javne nabave MINGORP-a kontinuirano prati promjene vezane uz primjenu eNabave. Budući da Uprava za sustav javne nabave ne predviđa izradu posebne studije vezane uz eNabavu, već kontinuirano prati promjene u tom sektoru, predlaže se brisanje mjere za 2009. godinu.				
50546	Provedba obuke trenera za izvođenje programa osposobljavanja primjenom ECDL obrasca provjere usvojenih znanja i vještina (X tečajeva, X trenera).	trajno	SDUU, SDUeH	U tijeku
Provedba:				
Aktivnost se kontinuirano provodi. Godišnje se održava jedan tečaj za izobrazbu trenera – 12 novih trenera godišnje.				
50547	Sudjelovanje u radu eSEE inicijative	trajno	SDUeH	U tijeku
Provedba:				
SDUeH sudjelovao je tijekom 2008. godine na 3 sastanka eSEE inicijative: 21. veljače u Bruxelles-u, 24. lipnja u Cavtatu te 27. i 28. listopada u Sarajevu.				
ePorezna				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50601	Uspostava sustava eTZ - Obračun članarine turističkoj zajednici	05-2008	MFIN PU, APIS IT	Provedeno

Provedba: Sustav za elektroničko plaćanje članarine turističkoj zajednici uspostavljen je u svibnju 2008. godine.				
50602	Uspostava sustava eSR – Godišnji obračun spomeničke rente	05-2008	MFIN PU, APIS IT	Provedeno
Provedba: Sustav za elektronički obračun spomeničke rente uspostavljen je u svibnju 2008. godine.				
50603	Uspostava sustava za prijavu IDD obrazaca putem Interneta	05-2008	MFIN PU, APIS IT	Provedeno
Provedba: Sustav za prijavu IDD obrazaca putem interneta je u probnoj produkciji. Realizacija sustava očekuje se nakon formalnog odobrenja. U tijeku je prilagodba novoj verziji obrasca (PU).				
50604	Uspostava sustava za godišnju prijavu poreza na dobit putem Interneta (ePD)	05-2008	MFIN PU, APIS IT	Provedeno
Provedba: Sustav za godišnju prijavu poreza na dobit putem Interneta uspostavljen u svibnju 2008. godine.				
50605	Uspostava sustava za godišnju prijavu poreza na dohodak (eDOH) putem Interneta	12-2008	MFIN PU, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Novi predviđeni rok - prosinac 2009. godine.				
50606	Uspostava sustava ePPPO – dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja (servis za poslodavce i osiguravatelje)	12-2008	MFIN PU, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera odgođena do daljnjeg. Novi predviđeni rok - prosinac 2009. godine.				
50607	Uspostava sustava za prijavu ID1 obrasca putem Interneta	12-2008	MFIN PU, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera odgođena za 2009. godinu. Prioritet je dan uvođenju OIB-a. Dostava se obavlja putem CD ili FDD medija.				
50608	Uspostava sustava za prijavu IP obrasca putem Interneta	12-2008	MFIN PU, APIS IT	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009

Provedba: Mjera odgođena za 2009. godinu. Prioritet je dan uvođenju OIB-a. Dostava se obavlja putem CD ili FDD medija.				
eCarina				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50701	Omogućavanje uvida u praćenje garancija u tranzitnim postupcima putem aplikacije Otpremnici@web	05-2008	MFIN CURH, APIS IT	Provedeno
Provedba: Uvid u praćenje garancija u tranzitnim postupcima dostupan je od svibnja 2008. godine putem aplikacije Otpremnici@web.				
50702	Uspostava elektroničke razmjene podataka u robnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije	06-2008	MFIN CURH, APIS IT	Provedeno
Provedba: Sustav za elektroničku razmjenu podataka u robnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u funkciji je od lipnja 2008. godine.				
50703	Uspostava interoperabilnost i interkonektivnost s informacijskim sustavom EU Novim računalno podržanim sustavom provoza (New Computerised Transit System – NCTS) bez trader modula	12-2008	MFIN CURH, APIS IT	Provedeno
Provedba: Aplikacija za NCTS v.3.2 je završena.				
50704	Razvoj sustava za upravljanje rizikom	12-2008	MFIN CURH, APIS IT	Provedeno
Provedba: Razvoj sustava za upravljanje rizikom proveden sukladno planu.				
ePravosuđe				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50801	Uspostava produkcije sustava eSpis na Općinskom sudu u Puli, Trgovačkom u Zagrebu i Splitu, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Općinskom građanskom sudu u Zagrebu	09-2008	MP, FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 06/2009

Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje do kraja lipnja 2009. godine. Trgovački sudovi u Zagrebu i Splitu te Općinski sud u Puli i Općinski kazneni sud u Zagrebu su u produkciji. Općinski građanski sud u Zagrebu prošao je edukaciju i krajem 2008. godine bio je u fazi testiranja aplikacije od strane korisnika. Očekuje se da do kraja lipnja 2009. godine i ovaj sud bude u produkciji.				
50802	Objaviti Geoportal na Internetu	09-2008	DGU	Nužno produljenje roka provedbe Novi rok – 06/2009
Provedba:				
Zbog osiguranja neophodnih preduvjeta za stalan i neprekinut rad sustava, puštanje u rad prolongirano je na lipanj 2009. godine.				
50803	Implementacija sustava eSpis na 4 lokacije: Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, Županijskom sudu u Zagrebu i Puli	12-2008	MP, FINA	Provedeno
Provedba:				
Tehničke pripreme za implementaciju su izvršene – napravljena snimka stanja, uspostava VLAN-a, podešavanje aplikacije. ŽS Zagreb je educiran i u fazi je testiranja dok će ostali sudovi biti educirani u narednom periodu. Očekuje se da svi ovi sudovi budu u produkciji do 30. svibnja 2009. godine.				
50804	Provedba projektiranja i generičkog kabliranja na 52 pravosudna tijela	12-2008	MP, FINA	Provedeno
Provedba:				
Provedba projektiranja i generičkog kabliranja na 52 pravosudna tijela je izvršena. Ovime svi općinski, županijski i trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj imaju uspostavljenu lokalnu računalnu mrežu.				
50805	Uspostava zajedničkog informacijskog sustava katastra nekretnina i zemljišnih knjiga (BZP)	trajno	MP, DGU	U tijeku
Provedba:				
Potpisan je ugovor i isporučena oprema te standardni software na kojem će budući ZIS funkcionirati (sustav katastra i BZP). Shodno odluci Vlade u suradnji sa APIS IT-om, oprema i software su isporučeni i instalirani u njihovom prostoru. Sam razvoj ZIS-a od strane Ericssona je završio faze analize i zahtjeva te se s početkom 2009. godine prelazi u fazu dizajna i razvoja.				
eZdravstvo				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
50901	Uspostaviti sigurni mail sustav u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Sigurnost se temelji na novim pametnim iskaznicama zdravstveno osiguranih osoba HZZO-a s osobnim certifikatom korisnika	06-2008	HZZO	Provedeno

Provedba:				
Uspostavljen je sigurni mail sustav za zdravstvene profesionalce u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Sigurnost se temelji na novim pametnim iskaznicama zdravstveno osiguranih osoba HZZO-a s osobnim certifikatom korisnika.				
50902	Uspostaviti interaktivne servise za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Praćenje statusa osiguranja i prava iz osiguranja	07-2008	HZZO	Provedeno
Provedba:				
Ovlaštene osobe obveznika uplate doprinosa kroz funkcionalnost servisa eZdravstveno mogu, ali samo za svoje zaposlenike, provjeriti status osiguranja osigurane osobe. Do kraja godine omogućit će se provjera svakom osiguraniku koji posjeduje iskaznicu zdravstveno osigurane osobe – isprava 2, ali isključivo za sebe, pridržavajući se svih odredbi oko zaštite osobnih podataka.				
50903	Uspostaviti interaktivne servise za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Odabir liječnika u PZZ-u	08-2008	HZZO	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 08/2009
Provedba:				
Zbog naknadno dobivenog zadatka uvođenja usluge eDopunsko (prijava na dopunsko osiguranje preko interneta), došlo je do pomaka u roku razvoja interaktivnog servisa “Odabir liječnika u PZZ-u”, a također su postojali određeni tehnički problemi oko procesa masovne personalizacije pametnih kartica. Tehničke probleme je isporučitelj opreme uspješno rješio, a od prosinca 2008. godine omogućen je proces masovne personalizacije pametnih kartica. Trenutno su u tijeku dorade servisa nakon provedenih akcija prvog testiranja.				
50904	Uspostaviti interaktivne servise za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Provjera uplate doprinosa	10-2008	HZZO	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 09/2009
Provedba:				
U pripremi su procedure oko razmjene podataka s Poreznom upravom koja prikuplja podatke oko uplaćenih doprinosa. HZZO nema podatke o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje za osiguranike koji su zaposleni kod pravnih subjekata. Ove podatke posjeduje Porezna uprava te će se projektom osobnog identifikacijskog broja riješiti pitanje prijena podataka.				
50905	Uspostaviti interaktivne servise za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Praćenje liste čekanja	10-2008	HZZO	Provedeno
Provedba:				
U suradnji s MZSS-om uspostavljene su nacionalne liste čekanja. Sigurni transfer podataka s bolnicama uspješno je riješen preko personaliziranog dijela portala www.cezih.hr .				
50906	Nadograditi sustav za poslovno izvješćivanje	11-2008	HZZO	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 07/2009

Provedba: Cjelokupni model sustava poslovnog izvješćivanja je izgrađen na testnim podacima koji po svojoj formi izgledaju stvarnoj produkciji. Slijedi instalacija programske podrške u produkcijsko okruženje te import stvarnih poslovnih podataka.				
50907	Nadograditi antivirusni podsustav informatičkog sustava HZZO-a	11-2008	HZZO	Provedeno
Provedba: Antivirusni podsustav informatičkog sustava HZZO-a uspješno je nadograđen.				
eObrazovanje				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
51001	Implementirati pametne iskaznice osoba u sustavu znanosti, obrazovanja i športa (SX)	09-2008	MZOŠ, CARNet, FER	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Započela je implementacija prve faze projekta koja će obuhvatiti 14 fakulteta na svim sveučilištima. Provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
51002	Implementirati programsko rješenja za sustav knjižničkog poslovanja i upravljanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (Voyager)	12-2008	MZOŠ, NSK	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u planiranom roku. Nije postignut koncenzus sveučilišnih knjižnica oko koncepta sustava, pa se provedba očekuje tijekom 2009. godine. U tijeku je implementacija novog programskog rješenja „Aleph“ u knjižnice sustava znanosti i visokih učilišta (dobavljač je preuzet od drugog te više ne daje podršku za sustav Voyager).				
51003	Umrežiti ustanove sustava obrazovanja u računalno-komunikacijsku mrežu CARNet i pristup Internetu	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: Ustanove se sukcesivno spajaju u skladu s tehničkim i financijskim mogućnostima.				
51004	Opremiti osnovne i srednje škole računalnom i programskom opremom (200 računalnih učionica, 50 interaktivnih ploča, licencirani softver)	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: Raspodijeljena je računalna oprema (200 računalnih učionica, 50 interaktivnih ploča, licencirani softver).				

51005	Opremiti visoka učilišta računalnom i programskom opremom (750 PC, 100 prijenosnika, 50 servera, 100 projektor, 80 štampača, 30 internet kioska, 10 interaktivnih ploča, licencirani softver...)	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: Računalna oprema raspodijeljena je po planu.				
51006	Pružiti uslugu autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava obrazovanja (AAI@EduHr)	trajno	MZOŠ, SRCE	U tijeku
Provedba: Usluge se kontinuirano koriste. U sustavu je trenutno 257 ustanova (37 udomljenih) sa 580.593 eldentiteta osoba. Donesen je Pravilnik o ustroju AAI@EduHr i imenovan Savjet.				
51007	Proširiti i održavati informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) – 100% obuhvat	trajno	MZOŠ, SRCE	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode po planu. Trenutno je u sustavu 70 ustanova sa više od 128.700 studenata.				
51008	Razvoj i održavanje implementiranog sustava eMaticice	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: eMatica se koristi i razvija prema zahtjevima korisnika. Implementirani sustav eMatica ušao je u potpunu primjenu za prikupljanje podataka te je integriran sa ostalim sustavima unutar informacijskog sustava MZOŠ-a te nekim drugim sustavima izvan IS-a MZOŠ-a.				
51009	Promocija pristupa bibliografskim on-line bazama podataka i eČasopisima	trajno	MZOŠ, CARNet	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
51010	Održavati Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" i uvesti nove digitalne obrazovne sadržaje iz nastavnih predmeta: matematike, fizike, biologije i kemije za sve godine srednjoškolskog obrazovanja te proširiti novim sadržajima za osnovne škole	trajno	MZOŠ, CARNet	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode po planu. Nastavlja se nabava novih interaktivnih obrazovnih sadržaja u 2009. godini.				
51011	Provesti obrazovanje za oko 7500 zaposlenika u osnovnim i srednjim školama za korištenje ICT-a u nastavi (ECDL)	trajno	MZOŠ	U tijeku

Provedba: Aktivnosti se provode po planu. Nastavlja se izobrazba zaposlenika u školstvu za ECDL u 2009.godini.				
eZnanost				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
51101	Objaviti pozive za prijavu projekata primjene IT	06-2008	MZOŠ	Provedeno
Provedba: Javni poziv za prijavu projekata objavljen je 30. travnja 2008. godine. Prijave su zatvorene 30. svibnja 2008. godine. Prijavljeno je ukupno 166 projekata.				
51102	Objaviti pozive za prijavu znanstvenih projekata i programa	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: Natječaj za prijavu znanstvenih projekata i programa trajno je otvoren.				
51103	Objaviti pozive za prijavu tehnoloških projekata	trajno	MZOŠ, HIT	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode prema planu. HIT sa svojim programom TEST ima trajno otvoren natječaj koji nema limitiran niti broj projekata koji bi definirao broj projekata iz područja ICT-a, niti se zahtjeva ograničavanje količine novca koja bi bila definirana i usko usmjerena samo na ICT projekte.				
51104	Predstaviti znanstvenicima i javnosti elnfrastrukturu	trajno	MZOŠ	U tijeku
Provedba: Aktivnost se kontinuirano provodi.				
eKultura				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
51201	Digitalizacija arhiva, knjižnica i muzeja – Nastavak projekta (objava na Web-u, obrada prijavnica, smjernice i upute za digitalizaciju...)	06-2008	MK	Provedeno
Provedba: Objavljen portal www.kultura.hr na Open Source CMS i web 2.0 elementima sa 4,9TB digitalizirane baštine i djelomično na engleskom jeziku. Odobren 31 program digitalizacije u ustanovama u kulturi, izrađene smjernice u skladu sa preporukama EU za odabir i pripremu građe za snimanje i pripremu pojedinačnih projekata digitalizacije, za odabir formata datoteka za pohranu i korištenje te HKB model podataka.				
51202	Omogućiti korisnicima naručivanje gradiva u arhivima putem elektroničkog obrasca	06-2008	HDA	Provedeno

Provedba: Naručivanje gradiva u arhivima putem elektroničkog obrasca korisnicima dostupno od studenoga 2008. godine.				
51203	Geografski informacijski sustav u zaštiti prirode (nastavak projekta koji se financira od strane Vlade Kraljevine Norveške) – Web servisi Geografskog informacijskog sustava	07-2008	MK	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 09/2009
Provedba: Mjera nije provedena u roku. Zbog kašnjenja u nabavi opreme za portal zaštite prirode, produljen je testni period te se realizacija projekta očekuje tijekom rujna 2009. godine.				
51204	Podnošenje on line prijavnica za financiranje javnih potreba u kulturi i prirodi	07-2008	MK	Provedeno
Provedba: Online prijavnice uspješno radile od 15. srpnja do 15. rujna 2008. godine prema raspisanom javnom natječaju za financiranje.				
51205	Implementirati sustav dostave podataka i popisa gradiva nadležnim arhivima u elektroničkom obliku	09-2008	HDA	Provedeno
Provedba: Sustav dostave podataka i popisa gradiva nadležnim arhivima u elektroničkom obliku implementiran prema planu.				
51206	Uspostava, razvoj, vođenje i koordinacija jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj	12-2008	AZO	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 06/2009
Provedba: Program ISZO (Informacijski sustav zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj) je u izradi. Rok za provedbu je, u skladu s uredbom o ISZO, 8. lipanj 2009. godine. Prijedlog Programa vođenja ISZO Republike Hrvatske za razdoblje 2009. - 2012. godine je izrađen i 19. rujna 2008. godine dostavljen u MZOPUG na očitovanje. 11. prosinca 2008. zaprimljeno je očitovanje MZOPUG-a u kojem se traže izmjene i dopune. AZO trenutno radi na traženim dopunama i izmjenama.				
51207	Web servisi za zaštitu prirode (sudjelovanje u međunarodnim tijelima i ostvarivanje naših obveza)	12-2008	MK	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera nije provedena u roku - provedba se očekuje tijekom 2009. godine.				
ePoslovanje				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status

51301	Imenovati koordinate provedbe Strategije elektroničkog poslovanja (sva tijela javne vlasti)	05-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: 24. travnja 2008. donijeta je Odluka o imenovanju Koordinatora provedbe Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010. godine.				
51302	Utemeljiti Nacionalno vijeće za elektroničko poslovanje	05-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Ova će se aktivnost provesti u sklopu cjelokupne provedbe Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010., a izvršenje se očekuje tijekom 2009. godine.				
51303	Uspostaviti institucionalnu osposobljenost za upravne poslove vezane za elektroničko poslovanje	06-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MINGORP-a (NN 41/08) osnovan je posebni Odjel za unapređenje elektroničkog poslovanja, a u okviru kojeg su ustrojena i dva odsjeka i to: Odsjek za primjenu elektroničkog potpisa i Odsjek za unapređenje elektroničke trgovine. U srpnju 2008. godine raspisan je natječaj za nove djelatnike, kako bi se predviđena radna mjesta popunila odgovarajućim stručnim kadrovima.				
51304	Uspostaviti i održavati elektroničke portale za javno znanje u područjima državnih poticaja	06-2008	MINGORP, MZOŠ, MMPI	Provedeno
Provedba: U okviru profila Gospodarstvo na Središnjem portalu javne uprave MojaUprava.hr uspostavljena je tema <i>Financije i poticaji</i> koja se kontinuirano ažurira aktualnim sadržajima iz javne uprave.				
51305	Osnovati registar OIEKPP - Registar projekta i postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača	09-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Sam registar osnovan je 1. srpnja 2007. godine i dosad je u njega upisano 136 projekta u okviru pribavljanja prethodnog energetskeg odobrenja i/ili energetskeg odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Izrada GIS baze je pri kraju te slijedi testiranje. Objava se očekuje u lipnju 2009. godine.				
51306	Uspostaviti interoperabilnost NCARH i EU BGCA (digitalni certifikat, elektronički potpis, verifikacija i ovjera)	11-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				

<p>Predloženu mjeru nije bilo moguće ostvariti sukladno planiranom, budući da je Europska komisija 28. studenog 2008. godine donijela Akcijski plan provođenja prekograničnih javnih usluga na europskom jedinstvenom tržištu za elektronički potpis i elektroničku identifikaciju s ciljem da državama članicama pomogne u provođenju međusobno priznatog i interoperabilnog ePotpisa i eldentifikacijskih rješenja. Sukladno tome, Europska komisija će sastaviti „Popis pouzdanih davatelja usluga certificiranja koji izdaju kvalificirane certifikate“ na europskoj razini, a koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o postojećim i kontroliranim davateljima usluga certificiranja sa svrhom olakšanja procesa ocjene valjanosti ePotpisa baziranih na kvalificiranim certifikatima. Sukladno preporuci i aktivnostima Europske komisije, umjesto povezivanja s EU BGCA, izradit će se Popis pouzdanih davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj.</p>				
51307	Izraditi prijedlog semantičkih i procesnih normi za eNarudžbenicu i eRačun	12-2008	HGK, MFIN, MINGORP, FINA	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
<p>Provedba:</p> <p>Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva osnovao je Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstava, banaka, gospodarstva i sveučilišta, s ciljem izrade i provedbe projekta eRačun. Izrada projekta je u tijeku, a pilot projekt će započeti u prvoj polovini 2009. godine.</p>				
51308	Izraditi prijedlog semantičkih i procesnih normi za elektroničko plaćanje	12-2008	HGK, MFIN, HUP, HNB, MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
<p>Provedba:</p> <p>Zbog uske povezanosti izdavanja računa i naplate, u projekt eRačun uključen je dio koji se odnosi na elektroničko plaćanje, pa se obje mjere poduzimaju i provode zajednički. Radna skupina HUB-a je prema HUB1 obrascu izradila i javno objavila eHUB obrazac u XML formatu. Navedeni obrazac namijenjen je sudionicima platnog prometa.</p>				
51309	Uspostaviti sustav za dodjelu nagrada i oznaka kvalitete za primjenu elektroničkog poslovanja	12-2008	HGK	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
<p>Provedba:</p> <p>Mjeru je moguće realizirati tek nakon završetka nekih projekata sadržanih u Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja za period 2007. – 2010. godine, pa će se njejoj realizaciji pristupiti u 2009. godini.</p>				
51310	Uspostaviti sustav savjetodavne potpore za primjenu elektroničkog poslovanja u malom i srednjem poduzetništvu	12-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
<p>Provedba:</p> <p>Mjera se provodi u suradnji s HAMAG-om, a podrazumijeva pružanje podrške uvođenju elektroničkog poslovanja u malom i srednjem poduzetništvu kroz sufinanciranje usluge savjetovanja. HAMAG provodi sufinanciranje konzultantskih usluga putem izdavanja vaučera za sufinanciranje usluge savjetovanja za malo gospodarstvo i certificiranje konzultanata. Budući da su konzultanti koji pružaju uslugu savjetovanja za elektroničko poslovanje tek marginalno zastupljeni, izrađen je plan i program za poticanje obrazovanja i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje i sufinanciranje konzultantskih usluga putem vaučera.</p>				

51311	Pokrenuti kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja	12-2008	MINGORP, HGK	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Izrađen je program za provođenje kampanje za primjenu elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj. No, kako se ukazala potreba da se u istu kampanju uključi i kampanja za uvođenje eRačuna u Republiku Hrvatsku, neophodno je sačekati s početkom provođenja kampanje i istu uskladiti s rezultatima rada Povjerenstva za uvođenje eRačuna.				
51312	Uspostaviti portal s cjelovitim informacijama o propisima, preporukama, normama i standardima, certifikaciji te najboljoj praksi i javnom znanju u primjeni elektroničkog poslovanja (nacionalni portal za ePoslovanje)	12-2008	MINGORP, APIS IT	Provedeno
Provedba: Portal je uspostavljen kao integralni dio središnjeg portala javne uprave Mojauprava (u vidu teme Elektroničko poslovanje, profila Gospodarstvo). Predviđena je kontinuirana nadogradnja, proširenje i održavanje portala.				
51313	Uspostaviti upravne funkcije za elektroničko poslovanje i inspekciju u području elektroničkog poslovanja u MINGORP	12-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba: Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, inspeksijski nadzor provedbe Zakona, osim MINGORP-a, obavlja i Državni inspektorat.				
51314	Uspostaviti sustav obrazovanja i certificiranja savjetnika za elektroničko poslovanje	12-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Mjera se provodi u suradnji s HAMAG-om, zajedno s mjerom 51310 – <i>ustpostava savjetodavne potpore za primjenu elektroničkog poslovanja</i> . Pod ovom mjerom se pored sufinanciranja usluge savjetovanja putem vaučera podrazumijeva i obrazovanje i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje. Budući da su konzultanti koji pružaju uslugu savjetovanja za elektroničko poslovanje tek marginalno zastupljeni, izrađen je plan i program za poticanje obrazovanja i certificiranje novih savjetnika za elektroničko poslovanje kako bi se njihov broj znatno povećao, ali podrazumijeva i dodatno obrazovanje u području elektroničkog poslovanja za sve certificirane konzultante, bez obzira na područje za koje su već certificirani.				
51315	Učiniti dostupnim sustav aplikacija za ePoslovanje namijenjen malom i srednjem poduzetništvu zasnovan na otvorenom kodu koji mora sadržavati barem aplikacije za osnovno uredsko poslovanje, elektronički potpis, izradu elektroničkog računa i računovodstvo	12-2008	MINGORP	Provedeno

Provedba:				
Izvršeno je istraživanje i razvoj rješenja temeljenih na otvorenom kodu za elektroničke module identificirane u okviru istraživanja generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacije priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničkih i funkcionalnih specifikacija eModula za njihovu implementaciju. U tijeku je provedba stilske, sadržajne i metodološke prilagodbe izričajju i metodologiji nacionalnog portala za elektroničko poslovanje, kao dijelu portala Mojauprava, a kako bi se rezultati provedbe javno objavili na portalu.				
51316	Akreditirati NCARH, RDC i RDC-TDU	12-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba se očekuje tijekom 2009. godine. Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo sukladno standardima preporučenim od strane Europske komisije. Zajedno s Hrvatskom akreditacijskom agencijom izvršeno je istraživanje uobičajene provedbe postupka akreditacije u zemljama članicama Europske unije te su sukladno tome pribavljeni standardi po kojima se mora vršiti postupak akreditacije.				
51317	Osnovati nacionalni centar za konverziju poruka formiranih u različitim formatima i standardima kako bi se i SME sektoru omogućilo uključivanje u B2B ePoslovanje	12-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				
S ciljem uvođenja elektroničkog računa u uporabu u Republici Hrvatskoj, osnovano je Povjerenstvo za eRačun. Poslovanikom zacrtane zadaće obavljaju se radom u okviru Povjerenstva i osnovanih odbora. Jedna od zadaća je donošenja odluke o primjenjivom formatu poruka, čija provedba je u tijeku. Do donošenja takve odluke nema potrebe za osnivanjem centra za konverziju poruka. Provedba mjere se očekuje tijekom 2009. godine.				
51318	Ovlastiti osnovani centar za konverziju poruka kao „trusted“ centar za kontrolu kvalitete rada providera na teritoriju Republike Hrvatske	12-2008	MINGORP	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba:				
Mjera nije provedena u planiranom roku – provedba je moguća po završetku mjere 51317.				
51319	Objaviti portal “eObrazovanje u poduzetništvu”	12-2008	MINGORP	Provedeno
Provedba:				
Portal HITPOP (Hrvatski InTernetski Portal za Obrazovanje u Poduzetništvu) javno je objavljen 30. svibnja 2008. godine na Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu u Šibeniku na adresi www.hitpop.hr .				
51320	Dodijeliti državne potpore za poticanje razvoja i proizvodnju opreme za primjenu obnovljivih izvora energije	12-2008	MINGORP	Provedeno

Provedba: Državne potpore za poticanje razvoja i proizvodnju opreme za primjenu obnovljivih izvora energije za 2008. godinu su dodijeljene i postupak je formalno završen u rujnu 2008. godine.				
51321	Proširiti obuhvat savjetodavnih usluga koje se financiraju u sklopu sustava regionalnih poslovnih centara sadržajima vezanim uz elektroničko poslovanje	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba: U okviru Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008. godinu, u dijelu II. - Obrazovanje za poduzetništvo, predviđena je mjera poticanja obrazovanja za elektroničko poslovanje. Ista se provodi u suradnji s HAMAG-om.				
51322	Provoditi godišnje studije o suradnji nacionalnih institucija na razvoju gospodarstva temeljenog na znanju i elektroničkog poslovanja, s prijedlogom mjera i modelima suradnje	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba: Mjera se trajno provodi. Zadnji dostupni podaci su iz Studije razvoja elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za 2006. i 2007. godinu i Studije prepreka za primjenu e-poslovanja u Republici Hrvatskoj za 2006. i 2007. godinu.				
51323	Provoditi godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba: Mjera se trajno provodi. Zadnji dostupni podaci su iz Studije prepreka za primjenu e-poslovanja u Republici Hrvatskoj za 2006. i 2007. godinu.				
51324	Održavati interoperabilnosti NCARH i EU BGCA (digitalni certifikat, elektronički potpis, verifikacija i ovjera)	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba: Ova mjera povezana je s mjerom 51306 - <i>Uspostava interoperabilnosti NCARH i EU BGCA</i> , a koja se po preporuci Europske komisije mora provoditi na način da se uspostave Popisi pouzdanih davatelja usluga certificiranja.				
51325	Ažuriranje i dopunjavanje katastra istražnih prostora mineralnih sirovina	trajno	MINGORP	U tijeku

Provedba: Vođenje katastra istražnih prostora mineralnih sirovina Republike Hrvatske kontinuirani je proces u MINGORP-u. Ministarstvo ažurira i upotpunjava postojeću grafičku bazu podataka istražnih prostora rasteriziranim i geokodiranim topografskim kartama mjerila 1:25000, odnosno u iste unosi podatke o odobrenim istražnim prostorima mineralnih sirovina, kao i podatke za istražne prostore za koje je prestalo važiti odobrenje istraživanja.				
51326	Ažuriranje i dopunjavanje katastra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina	trajno	MINGORP	U tijeku
Provedba: Vođenje katastra eksploatacijskih prostora mineralnih sirovina Republike Hrvatske kontinuirani je proces u MINGORP-u. Ministarstvo ažurira i upotpunjava postojeću grafičku bazu podataka eksploatacijskih polja rasteriziranim i geokodiranim topografskim kartama mjerila 1:25 000, odnosno u iste unosi podatke o odobrenim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, kao i podatke o prestanku važenja odobrenja za pojedina eksploatacijska polja.				

3.3. Nastavak izgradnje informacijskog društva

Cilj je informacijskog društva osigurati svim stanovnicima pristup informacijama. Imajući u vidu kako je danas sve veći broj informacija dostupan u digitalnom obliku važno je svakom stanovniku osigurati jednak pristup informacijama, odnosno stvoriti uvjete u kojima će od društva znanja koristiti imati svi, bez obzira na zemljopisne, socijalne, generacijske ili bilo koje druge posebnosti.

Ključne aktivnosti prema ostvarenju ovog cilja jesu:

- omogućavanje ravnopravnog pristupa tehnologijama informacijskog društva svim društvenim skupinama (osobe s posebnim potrebama, branitelji, nezaposleni, umirovljenici i dr.),
- sustavan rad poslovnog sektora i akademske zajednice na povećanju informatičke pismenosti cijele populacije.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, tijekom 2008. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
60101	Obilježen Svjetski dan informacijskog društva	17. svibnja 2008.	SDUeH	Provedeno
Provedba: Kako bi građane upoznali s aktivnostima i ostvarenjima Vlade Republike Hrvatske na izgradnji informacijskog društva, 17. svibnja 2008. godine obilježen je Svjetski dan informacijskog društva u organizaciji SDUeH. U skladu sa smjernicama UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, u 2008. godini pozornost je bila usmjerena na osiguravanje pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi, kako bi im se omogućio život neovisan o tuđoj pomoći i potpuno sudjelovanje u svim područjima života.				

60102	Sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji zemalja članica Europske unije o eUključivosti	30. studenoga - 2. prosinca 2008.	SDUeH	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>U razdoblju od 30. studenoga do 2. prosinca 2008. godine u organizaciji Europske komisije i Vlade Republike Austrije u Beču je održana Ministarska konferencija zemalja članica Europske unije o eUključivosti. Na Konferenciji i popratnoj izložbi sudjelovala je i Republika Hrvatska koju je tom prilikom predstavljao SDUeH. Aktivnosti Republike Hrvatske na izgradnji uključivog društva predstavljene su kroz osam projekata: Teleaccess, eOtoci, Infolex/Blindex, Vergilius, Internet bez straha, Obrazovanjem do socijalne uključenosti, Znanjem do posla i Baza udruga Republike Hrvatske.</p>				
60103	Sudjelovanje u Projektu Teleaccess	12-2008	SDUeH	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Sufinanciran sredstvima EU i Državnog proračuna Republike Hrvatske, projekt Teleaccess omogućuje razvoj informacijskog društva u slabije povezanim geografskim područjima kroz korištenje naprednih informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. Projekt je realiziran i uhodan u nekoliko zemalja EU (Italija, Grčka, Bugarska, Poljska), dok su u Hrvatskoj pilot-projekti formirani u Skradu i Vinkovcima. Misija Telecentra je edukacija stanovništva u lokalnim i ruralnim sredinama putem različitih interaktivnih radionica i seminara s ciljem proširenja njihova znanja, poboljšanja komunikacije i praktične primjene novih tehnologija što će, u konačnici, poboljšati njihovu konkurentnost na tržištu rada. Projekt u Hrvatskoj je završen te je Europskoj komisiji dostavljen financijski i narativni izvještaj o tijeku provedbe Projekta.</p>				
60104	Sudjelovanje u Pilot projektu "eUključiva Hrvatska"	12-2008	SDUeH, UPOI	U tijeku
<p>Provedba:</p> <p>SDUeH i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom započeli su krajem 2008. godine pripreme za razvoj pilot projekta radnog naziva "eUključiva Hrvatska". Riječ je o projektu koji ima za cilj omogućiti osobama s invaliditetom u četiri udruge u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku uvid u način govornog upravljanja kućom, a čija se provedba planira za 2009. godinu. Ovaj projekt predstavlja važnu aktivnost u okviru Plana provedbe Programa e-Hrvatska koji se odnosi na ostvarenje eSveobuhvatnosti, a odvija se u suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci.</p>				

4. PRAĆENJE RAZVOJA INFORMATIZIRANOSTI JAVNIH USLUGA NA INTERNETU

Europska komisija prepoznala je 20 osnovnih područja koja je kao područja javnih usluga u kojima je najčešća interakcija građana i poslovnih subjekata s javnom administracijom. Tih 20 područja dopunili smo područjima za koja u Hrvatskoj postoji poseban interes (poljoprivreda, turizam, kultura, državna inspekcija i zaštita osobnih podataka). Od 20 osnovnih područja usluga 12 je za građane, a 8 za poduzetnike. Navedeno razlikovanje preuzeto je Programom e-Hrvatska, a poradi mogućnosti usporedbe, prihvaćeno je i u okviru Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu.

Tablica 5. Područja usluga

Osnovna područja usluga		
Građani	Poslovni subjekti	Javne usluge od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
1. Porez na dohodak	1. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenika	1. Poljoprivreda
2. Zapošljavanje	2. Porez na dobit	2. Turizam
3. Socijalne naknade	3. Porez na dodanu vrijednost	3. Kultura
4. Osobni dokumenti	4. Registracija novog poduzeća	4. Državne inspekcije
5. Registracija vozila	5. Prijava podataka Državnom zavodu za statistiku	5. Zaštita osobnih podataka
6. Građevna dozvola	6. Carinska deklaracija	6. Imovina Republike Hrvatske
7. Prijave policiji	7. Zaštita okoliša	
8. Javne knjižnice	8. Javna nabava	
9. Državne matice		
10. Visokoškolsko obrazovanje		
11. Boravište / prebivalište		
12. Zdravstvene usluge		

Prema metodologiji Europske komisije razina informatiziranosti se mjeri na skali od 0 do 5.

Tablica 6. Razine informatiziranosti

Razina informatiziranosti	Značenje
0 – Nema informacije	Informacija o usluzi nije dostupna na mreži
1 – Informacija	Na mreži je dostupna samo informacija o usluzi (npr. opis postupka, pravilnici i sl.)
2 – Jednosmjerna interakcija	Dostupnost formulara u elektroničkom obliku za pohranjivanje na računalu. Prazne formulare moguće je i otisnuti na pisaču.
3 – Dvosmjerna komunikacija	Interaktivno ispunjavanje formulara i prijava uz autentikaciju. Ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga.
4 – Transakcija	Cijela usluga je dostupna na mreži, popunjavanje formulara, autentikacija, plaćanje i isporuka potvrda, narudžbe ili drugi oblici potpune usluge putem mreže.
5 – Ciljana automatizirana proaktivna usluga	Usluga je u potpunosti prilagođena individualnom korisniku, automatizirana i proaktivna. To znači da korisnik dobiva na vrijeme upozorenje da treba dostaviti neke podatke ili pokrenuti elektroničku uslugu pri čemu mu se automatski nudi elektronički formular u koji su upisane sve informacije koje o korisniku već postoje u informacijskim sustavima javne uprave.

U Tablici 7. predstavljene su usluge za građane s informacijama o razini informatiziranosti iz 2007. godine, planiranom razinom informatiziranosti za 2008. godinu, stanjem na kraju 2008. godine i razinom informatiziranosti predviđenim programom i2010.

Tablica 7. Pregled usluga za građane

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
1. POREZ NA DOHODAK					
Prijava poreza na dohodak	MFIN PU	2	4	-	4
2. ZAPOŠLJAVANJE					
Prijava u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ²	HZZ	3	3	3	3
Pretraživanje slobodnih radnih mjesta	HZZ	3	3	3	3
Predprijava ³	HZZ	0	2	2	3
Potvrda o statusu na evidenciji HZZ-a	HZZ	0	2	2	4
Pregled baze nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja	HZZ	0	2	3	3
Prijava slobodnih radnih mjesta	HZZ	0	3	2	3

² Na Hrvatski zavod za zapošljavanje mogu se prijaviti sve nezaposlene i zaposlene osobe. (Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03))

³ Predlaže se brisanje usluge jer je sadržana u usluzi „Prijava u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
Upućivanje kandidata prema prijavi poslodavca	HZZ	1	1	1	4
Objava životopisa na WEB-u	HZZ	0	4	4	4
Prijava na slobodno radno mjesto	HZZ	1	1	1	3
Izravna prijava nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja na slobodno radno mjesto koje poslodavac objavi u HZZ-u	HZZ	1	1	1	4
Informiranje o statusu zahtjeva za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, informacije o isplatama, stanju duga, povrata duga	HZZ	0	3	3	3
Podnošenje zahtjeva za dobivanje radne dozvole za stranca ⁴	MUP	2 ⁵	2 ²	2	3
Podnošenje zahtjeva za dobivanje poslovne dozvole za stranca	MUP ⁶	2 ³	2 ³	2	3
Prijava i odjava djelatnika ⁷	HZZ	3	3	3	3
3. SOCIJALNE NAKNADE					
Podnošenje zahtjeva za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu	HZMO	2	2 ⁶	4	4
Podnošenje zahtjeva za invalidsku mirovinu	HZMO	2	2 ⁶	2	4
Podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu	HZMO	2	2 ⁶	2	4
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatu za djecu	HZMO	2	2 ⁶	2	4
Podnošenje zahtjeva za naknadu zbog tjelesnog oštećenja	HZMO	2	2 ⁶	2	4
Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje staža	HZMO	2	2	2	4
Podnošenje obavijesti za pretkompletiranje	HZMO	2	3	3	4
Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o isplaćenju mirovini	HZMO	2	3	2	4

⁴ Podnosi poslodavac (pravna ili fizička osoba) nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu svog sjedišta.

⁵ Podizanje razine informatiziranosti moguće je tek nakon donošenja novog Zakona o strancima čija je izrada u tijeku.

⁶ Iznimno, stranci koji pružaju usluge u ime inozemnog poslodavca zahtjev za izdavanje poslovne dozvole mogu podnijeti i u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

⁷ Predlaže se brisati uslugu jer je sadržana u ostalim uslugama

⁶ Zbog zakonske regulative dokazi za ostvarivanje prava – javne isprave moraju biti u papirnatom obliku. Jedan od preduvjeta za dizanje razine usluga je realizacija projekta državnih matrica

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
Razmjena podataka s inozemnim nositeljima mirovinskog osiguranja	HZMO	0	3	1	4
Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje	HZZO	4	4	4	4
Prijava promjene osiguranja	HZZO	4	4	4	4
Odjava s osiguranja	HZZO	4	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za upućivanje na liječenje u inozemstvo	HZZO	2	3	2	4
Podnošenje zahtjeva za osnovno zdravstveno osiguranje	HZZO	4	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za dopunsko zdravstveno osiguranje	HZZO	2	4	2	4
Uspostava interaktivnih servisa za osiguranike HZZO-a; Provjera uplate doprinosa	HZZO	2	4	2	-
Uspostava interaktivnih servisa za osiguranike HZZO-a; Praćenje listi čekanja	HZZO	2	4	2	-
Uspostava interaktivnih servisa za osiguranike HZZO-a; Odabir liječnika u sustavu primarne zdravstvene zaštite	HZZO	2	4	2	-
Uspostava interaktivnih servisa za osiguranike HZZO-a; Praćenje statusa osiguranja i prava iz osiguranja	HZZO	2	4	2	-
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti	HZZ	3	3	2	4
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na školarinu	MZOŠ, Uredi državne uprave u županijama	3	3	3	4
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju	MZOŠ, Uredi državne uprave u županijama	3	3	3	4
4. OSOBNI DOKUMENTI					
Podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice	MUP	2	2	2	3
Podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice za strance	MUP	2	2	2	3
Podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice	MUP	1	1	1	3

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
Podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole	MUP	2	2	2	3
Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka	MP	2	2	2	3
5. REGISTRACIJA VOZILA					
Podnošenje zahtjeva za prvu registraciju motornih i priključnih vozila	MUP	1	1	1	4
Podnošenje zahtjeva za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova	MMPI	2	2	2	2
Podnošenje zahtjeva za produljenje registracije motornih i priključnih vozila	MUP	4	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za odjavu motornih i priključnih vozila	MUP	1	1	1	4
Podnošenje zahtjeva za promjenu vlasnika motornih i priključnih vozila	MUP	1	1	1	4
Podnošenje zahtjeva za probne pločice	MUP	1	1	1	4
Prijava nestanka prometne dozvole/knjižice vozila	MUP	1	1	1	4
Podnošenje zahtjeva za izdavanje nove prometne dozvole/ knjižice vozila	MUP	1	1	1	4
6. GRAĐEVNA DOZVOLA					
Podnošenje zahtjeva za izvatkom iz zemljišne knjige	MP	2	2	2	4
Podnošenje zahtjeva za izvatkom iz katastarskog operata	DGU	2	2	2	4
7. PRIJAVE POLICIJI					
Prijava kaznenog djela	MUP	1	1	1	3
8. JAVNE KNJIŽNICE					
Pretraživanje sadržaja/ kataloga	MK, MZOŠ	3	3	3	3
Pristup/uvid u sadržaj	MK, MZOŠ	3	3	3	3
9. DRŽAVNE MATICE					
Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih	SDUU	1	1	1	3
Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih	SDUU	1	1	1	3
Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica)	SDUU	1	1	1	3

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dokaza o državljanstvu (domovnica)	SDUU	1	1	1	3
Podnošenje zahtjeva za stjecanje / prestanak državljanstva	MUP	2	2	2	3
10. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
Upis na visokoškolsku ustanovu	MZOŠ	2	2	2	4
Upis na višu godinu	MZOŠ	4	4	4	4
Upis pada / ponavljanja godine	MZOŠ	4	4	4	4
11. BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE					
Prijava prebivališta	MUP	2	2	2	3
Prijava promjene adrese stanovanja	MUP	2	2	2	3
Odjava prebivališta	MUP	2	2	2	3
Prijava boravišta	MUP	2	2	2	3
Prijava/odjava boravišta/ prebivališta za strance	MUP	1	2	1	3
Prijava promjene adrese za strance	MUP	1	2	1	3
12. ZDRAVSTVENE USLUGE					
Naručivanje	MZSS	4	4	4	4
Konzultacije o dostupnim uslugama	MZSS	4	4	4	4

U Tablici 8. predstavljene su usluge za poduzetnike s informacijama o razini informatiziranosti iz 2007. godine, planiranom razinom informatiziranosti za 2008. godinu, stanjem na kraju 2008. godine i razinom informatiziranosti predviđenim programom i2010.

Tablica 8. Usluge za poduzetnike

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
1. MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA					
Podnošenje zahtjeva za osnovno zdravstveno osiguranje	HZZO	4	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za dopunsko zdravstveno osiguranje	HZZO	4	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za inozemno zdravstveno osiguranje	HZZO	2	4	2	4
Prijava i odjava zaposlenika u sustavu obveznog mirovinsko osiguranje	HZMO	4	4	4	4

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.	Cilj i2010
2. POREZ NA DOBIT					
Prijava poreza na dobit	MFIN PU	2	4	4	4
3. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST					
Prijava poreza na dodanu vrijednost	MFIN PU	4	4	4	4
4. REGISTRACIJA NOVOG PODUZEĆA					
Registracija tvrtke	MP	3	3	3	4
Registracija obrta	MINGORP	3	4	3	4
5. PRIJAVA PODATAKA DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU					
Prijava poslovnog subjekta	DZS	2	2	2	3
Prijava dijela poslovnog subjekta (poslovne jedinice)	DZS	2	2	2	3
6. CARINSKA DEKLARACIJA					
Podnošenje carinske deklaracije za poslovne subjekte	MFIN CURH	3	4	3	3
7. ZAŠTITA OKOLIŠA					
Podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja uvjerenja o vremenu te izradu ekspertiza i stručnih studija ⁸ (meteorološki, hidrološki, klimatološki podatci)	DHMZ	2	3	2	4
8. JAVNA NABAVA					
Uvid u objave javnih nadmetanja	MINGORP	3	3	3	4

U Tablici 9. predstavljene su javne usluge od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku s informacijama o razini informatiziranosti iz 2007. godine, planiranom razinom informatiziranosti za 2008. godinu i stanjem na kraju 2008. godine. S obzirom da ove usluge nisu predviđene programom i2010, nema podataka o ciljanoj razini informatiziranosti u EU.

Tablica 9. Javne usluge od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.
1. POLJOPRIVREDA				
Podnošenje zahtjeva za kredit	MPRRR	2	2	2

⁸ Davanje podataka na temelju kojih se izdaju najrazličitija uvjerenja (među ostalim i fizičkim osobama za naplatu šteta od osiguravajućih društava) te sačinjavaju izvještaje, ekspertize i stručne studije o meteorološkim, klimatološkim i hidrološkim čimbenicima kao i njihovom utjecaju na okoliš.

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.
Prijava za dobivanje poticaja	MPRRR	2	2	2
Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava	MPRRR	2	2	2
Podnošenje zahtjeva za dobivanje rješenja iz područja veterinarstva	MPRRR	2	2	2
Podnošenje zahtjeva za dodjelu određene količine robe za uvoz u okviru carinske kvote	MPRRR	2	2	2
Upis u Upisnik ekoloških proizvođača	MPRRR	2	2	2
2. TURIZAM				
Prijava sudjelovanja u programima kreditiranja	MINT	2	3	2
Prijava i odjava turista	MINT	2	2	2
Prijava chartera	MMPI	4	4	4
Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije ugostiteljskih smještajnih objekata u nadležnosti ureda DU	MINT	1	2	2
Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije smještajnih objekata: hoteli	MINT	1	3	2
Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije smještajnih objekata: kampovi	MINT	1	3	2
Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije smještajnih objekata: luke nautičkog turizma – marine	MINT	1	3	2
3. KULTURA				
Podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem	MK	3	3	4 ⁹
Podnošenje zahtjeva za poreznim olakšicama za kulturu i umjetnost	MK	1	3	1 ¹⁰
4. DRŽAVNE INSPEKCIJE				
Prijave za inspekcijski nadzor nad trgovačkim društvima/obrtima	DI	3	4	4
Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o kvaliteti uvezene robe	DI	2	4	..11

⁹ Podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem projekata koji se financiraju iz sredstava EU (Program KULTURA – baza se nalazi na web stranicama CULTURENet –a <http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=57>, a zakonski okvir na stanicama MK <http://www.min-kulture.hr/ccp/>)

¹⁰ Zbog malog broja zahtjeva (1 do 2 godišnje) i njihove potpune različitosti, nemamo unificirani obrazac za sada, nego na web stranicama opisni dio Porezne olakšice za donatore kulture i umjetnosti

¹¹ Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvaliteti uvezene robe – donošenjem novog Zakona o državnom inspektoratu (NN br. 116/08) ukinuti su čl. 14-18 (vezani za Nadzor kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje) starog Zakona o državnom inspektoratu (NN br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05, 129/05, 140/05, 138/06, 79/07)

Područje usluge – Usluga	Nadležno tijelo državne vlasti	Stanje 2007.	Cilj 2008.	Stanje 2008.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja inspektoru rada za sudjelovanje malodobnika mlađih od 15 godina u naplatnom sudjelovanju u snimanju filmova ¹²	DI	2	4	4
Podnošenje zahtjeva za obavljanjem nadzora radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ¹³	DI	2	4	4
Podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preraspodjelu radnog vremena	DI	2	4	4
Izdavanje obavijesti o prekovremenom radu radnika ¹⁴	DI	2	4	4
Dostavljanje godišnjeg izvješća o ozljedama na radu	DI	2	4	4
Prijava smrtnih, skupnih i teških ozljeda	DI	2	4	4
5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA				
Evidentiranje zbirke osobnih podataka u Središnji registar	AZOP	3	3	3
Uvid u Središnji registar evidencija zbirke osobnih podataka	AZOP	4	4	4
6. IMOVINA REPUBLIKE HRVATSKE				
Podnošenje zahtjeva za korištenje ili raspolaganje državnom imovinom	SDUUDI	2	3	2

¹² Prema članku 21. stavak 2. Zakona o radu

¹³ Prema članku 35. Zakona o pravima branitelja iz domovinskog rata i njihovih obitelji

¹⁴ Prema članku 41. stavak 2. Zakona o radu

5. PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE

Tijela državne uprave nadležna za provođenje pojedinih mjera dostavljaju Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku mjesečna izvješća o stanju provedbe eProjekata u njihovoj nadležnosti te, na traženje, i ostale podatke vezane za razvoj informacijskog društva. Temeljem zaprimljenih izvješća Središnji državni ured za e-Hrvatsku zadužen je za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o stanju provedbe Programa e-Hrvatska kojeg podnosi Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

U 2008. godini, na području praćenja provedbe i izvještavanja, planirana je provedba ukupno 9 mjera, od čega se 4 mjere trajno provode. Sukladno rezultatima Godišnjeg izvješća, od mjera s rokom provedbe u 2008. godini, na vrijeme su provedene 3, dok je za 2 naznačeno nužno produljenje roka provedbe.

Provedba planiranih aktivnosti

Praćenje provedbe i izvještavanje				
Oznaka	Mjera	Rok provedbe	Nositelji	Status
70101	Prijava podataka o projektima razvoja informacijskog društva na portalu za praćenje provedbe odluka Svjetskog samita o informacijskom društvu (http://www.itu.int/wsis/stocktaking)	06-2008	sva TDU	Nužna promjena roka provedbe. Novi rok - trajno
Provedba: Rok provedbe mjere prevest će se u trajno, a SDUeH će koordinatorima za provedbu Programa e-Hrvatska dati dodatna objašnjenja o postupcima prijave.				
70102	Izraditi analizu postojećih statističkih pokazatelja tržišta i definiranje detaljnijih statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnih usluga	09-2008	MMPI, HAKOM	Provedeno
Provedba: HAKOM je izradio analizu postojećih statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnog pristupa te definiranje detaljnijih pokazatelja. Prikupljanje detaljnijih statističkih pokazatelja će započeti u I. kvartalu 2009.				
70103	Izraditi tabeliranje podataka o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima prema transmisijskom zahtjevu Eurostata u okviru MB PHARE 2006 projekta	12-2008	DZS	Provedeno
Provedba: Tabeliranje podataka o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima izrađeno sukladno planu.				

70104	Izraditi tabeliranje podataka o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima prema transmisijском zahtjevu Eurostata u okviru MB PHARE 2006 projekta	12-2008	DZS	Provedeno
Provedba: Tabeliranje podataka o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima izrađeno sukladno planu.				
70105	Izraditi studiju dostupnosti javnih usluga na Internetu u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu	12-2008	SDUeH	Nužno produljenje roka provedbe. Novi rok – 12/2009
Provedba: Tijekom lipnja i srpnja 2008. kontaktirana je Europska komisija sa zamolbom da se Republici Hrvatskoj omogući sudjelovanje u projektu eGovernment benchmarking. U siječnju 2009. godine ponovno su zatražene informacije o mogućnosti uključivanja Republike Hrvatske buduću Hrvatska plaća članarinu u projektu CIP ICT iz kojeg se financira ovaj projekt. U ovom trenutku još uvijek se očekuje odgovor Europske komisije o proceduri uključivanja u projekt.				
70106	Izrada mjesečnih izvješća	trajno	sva TDU	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode po planu. Sva nadležna tijela redovno dostavljaju mjesečna izvješća SDUeH.				
70107	Praćenje statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnih usluga te objavljivanje podataka na internetskoj stranici Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije	trajno	HAKOM	U tijeku
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
70108	Redovito (mjesečno/kvartalno/godišnje) objavljivanje statističkih pokazatelja tržišta širokopojsnih usluga	trajno	DZS	U tijeku
Provedba: DZS u sklopu provedbe aktivnosti iz svoje nadležnosti, u redovitim izdanjima Statističkih izvješća objavljuje godišnje podatke o broju pretplatnika širokopojsnog pristupa.				
70109	Prijava podataka o projektima razvoja informacijskog društva na portalu za razmjenu najbolje prakse u EU i zemljama kandidatima epractice.eu	trajno	sva TDU	U tijeku
Provedba: Zbog nejasnoća oko postupka prijavljivanja projekata na portal, SDUeH će koordinadorima za provedbu Programa e-Hrvatska dati dodatna objašnjenja o postupcima prijave.				

Prilog A - Pregled kratica

Kratica	Opis
APIS IT	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
AZO	Agencija za zaštitu okoliša
AZOP	Agencija za zaštitu osobnih podataka
bSEE	Inicijativa u okviru Pakta o stabilnosti za poticanje širokopojasnog pristupa Internetu u jugoistočnoj Europi (engl. <i>broadband South Eastern Europe</i>)
BZP	Baza zemljišnih podataka
CARNet	Hrvatska istraživačka i akademska mreža (engl. <i>Croatian Academic and Research Network</i>)
CEPT	Europski kongres administracija za poštu i telekomunikacije (franc. <i>Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications</i>)
DAMIR	Digitalni arhiv mrežnih izvora
DGU	Državna geodetska uprava
DHMZ	Državni hidrometeorološki zavod
DI	Državni inspektorat
DZM	Državni zavod za mjeriteljstvo
DZS	Državni zavod za statistiku
ECDL	europski standard za provjeru osnovnog znanja rada na računalu – europska vozačka dozvola za računalo (engl. <i>European Computer Driving Licence</i>)
eSEE	Inicijativa za elektroničku Jugoistočnu Europu (eng. <i>Electronic South Eastern Europe</i>)
ETSI	Europski zavod za telekomunikacijske norme (engl. <i>European Telecommunications Standards Institute</i>)
EU	Europska unija
FER	Fakultet elektrotehnike i računarstva
FINA	Financijska agencija
HAKOM	Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
HAMAG	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
HDA	Hrvatski državni arhiv
HGK	Hrvatska gospodarska komora
HIDRA	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
HIT	Hrvatski institut za tehnologiju
HITRONet	Računalno komunikacijska mreža tijela državne uprave
HNB	Hrvatska narodna banka
HUP	Hrvatska udruga poslodavaca
HZMO	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
HZZ	Hrvatski zavod za zapošljavanje
HZZO	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
ICT	Informacijsko-komunikacijska tehnologija (engl. <i>Information and Communications Technology</i>)

Kratika	Opis
IDD	Oznaka obrasca Izvješća o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
IT	Informacijska tehnologija
ITU	Međunarodna telekomunikacijska unija
MFIN	Ministarstvo financija
MFIN CURH	Ministarstvo financija – Carinska uprava
MFIN PU	Ministarstvo financija – Porezna uprava
MINGORP	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
MK	Ministarstvo kulture
MINT	Ministarstvo turizma
MMPI	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
MORH	Ministarstvo obrane
MP	Ministarstvo pravosuđa
MPRRR	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
MUP	Ministarstvo unutarnjih poslova
MZOŠ	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
MZSS	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NSK	Nacionalna sveučilišna knjižnica
RPS	Registar poslovnih subjekata
SAFU	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
SDUeH	Središnji državni ured za e-Hrvatsku
SDUU	Središnji državni ured za upravu
SDUUDI	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
SRCE	Sveučilišni računski centar
TDU	Tijelo državne uprave
UPOI	Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
UVNS	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
VEM	Vijeće za elektroničke medije
WCAG	Preporuke za dostupnost mrežnog sadržaja (engl. <i>Web Content Accessibility Guidelines</i>)
WSIS	Svjetski samit o informacijskom društvu održan 2003. u Ženevi i 2005. u Tunisu (engl. <i>World Summit on Information Society</i>)
ZSIS	Zavod za sigurnost informacijskih sustava
XML	Proširivi jezik za označavanje podataka, podskup standardnog općeg jezika za označavanje (engl. <i>Extensible Markup Language</i>)

Prilog B - Popis koordinatora

Tijelo javne vlasti	Koordinator
Ministarstvo financija	Ivan Rašeta
Ministarstvo financija, Carinska uprava	Zlatica Tomašević
Ministarstvo financija, Porezna uprava	Milan Klišanić
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Ema Culi
Ministarstvo kulture	Marica Mikec
	Jasminka Draženović
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	mr. sc. Kristina Bubanko-Žiger
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	Mario Reiner
Ministarstvo obrane	mr. sc. Darko Galinec
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	Nataša Benić Einbüchler
	Davor Kralj
Ministarstvo pravosuđa	Tanja Magdić Ukalović
Ministarstvo unutarnjih poslova	Josip Trbuščić
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	mr. sc. Ivan Matić
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	Damir Stanić
	Vladimir Galić
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	Ante Zvonimir Golem, dr. med.
	Zlata Kedžo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlasta Mijić
	Sabina Kovačević Rajić
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Ivančica Urh
Ministarstvo turizma	Bosiljko Domazet
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije	Damir Pavao Govorčin
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	Tomislav Boban, dipl.iur.
Središnji državni ured za upravu	mr. sc. Leda Lepri
Središnji državni ured za e-Hrvatsku	Tomislav Vračić
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost	mr. sc. Aleksandar Klaić
Državna geodetska uprava	Zoran Vujić
Državni hidrometeorološki zavod	mr.sc. Ivanka Mihovilić
Državni inspektorat	Petar Baburić
	Renata Diankov
Državni zavod za intelektualno vlasništvo	Mario Jendek
Državni zavod za mjeriteljstvo	Ankica Jagnjić, prof.
Državni zavod za nuklearnu sigurnost	Ivan Poljičanin

Tijelo javne vlasti	Koordinator
Državni zavod za statistiku	Branka Cimermanović
Državni zavod za zaštitu od zračenja	Nikša Sviličić
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	Miroslav Pavić
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA	Ana Garvas Delić
	mr. sc. Maja Cvitaš
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.	Dunja Jurica
	Mladen Kostešić
Agencija za zaštitu okoliša	Jasna Butuči
	Robert Labavić
Agencija za zaštitu osobnih podataka	Vilena Gašparović
	Juraj Ljubešić
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	Mislav Kršulović
Financijska agencija	Ante Šimunović
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM	mr. sc. Željko Tabaković
Hrvatska gospodarska komora	mr. sc. Marijan Frković
Hrvatski državni arhiv	Jozo Ivanović
Hrvatski zavod za norme	Snježana Zima
	Jasminka Čupurdija
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	Zoran Kordić
Hrvatski zavod za zapošljavanje	Ilija Rašić
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	Hrvoje Jezidžić
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu	Vanda Čuljat
	Goran Klopotan
Središnji registar osiguranika - REGOS	Damir Korošić
	Đorđe Nižetić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet	Zvonimir Stanić
	Vlado Pribolšan
